

OFICIO Nº 339/2026 – GAB. SINURB

Chapadina MA, 30 de julho de 2026.

À Senhora
DEUSILENE MENESES PONTES
Secretária de Municipal Finanças

Assunto: Processo para pagamento da 2ª medição dos serviços de construção de espaço esportivo comunitário tipo B – Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), executados pela Empresa IDL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Senhora Secretaria,

Com os cumprimentos iniciais, aproveitamos do expediente, para encaminhar em anexo processo para pagamento da **2ª medição** de serviços executados pela empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**, sob nº CNPJ: 00.513.233/0001-98, referente execução dos **serviços de construção de espaço esportivo comunitário tipo B, no Residencial Esplanada - Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Ministério do Esporte**, Conforme:

Contrato nº 017/2026,
Processo Adm. nº 5492/2025,
Concorrência nº 038/2025,
Convênio nº 980416/2025 - ME
NF nº 092,
Valor R\$ 211.635,31

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO DO BRASIL
AG. 4223-0
C/C. 50835-7
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

PREFEITURA MUN. DE CHAPADINHA
DATA RECEBIMENTO 31/07/26
ÀS: 10:23h
ASSINATURA [Assinatura]

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos ao tempo que renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Ao
Sr. Raimundo Peres da Silva Filho
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CHAPADINHA-MA

REF.: 2ª MEDIÇÃO CONTRATO 017/2026

OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

A empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na **Rua Das Juçaras, Cond Executive Lake, Número 3, Sala 402, Renascença, São Luís – MA, CEP 65.075 – 230** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **00.513.233/0001 – 98**, através da sua sócio proprietário **THOMPSON BEZERRA CARNEIRO SOBRINHO**, CPF **845.214.653-15**, RG **888297980**, vem solicitar a **2ª medição do contrato para construção do espaço esportivo comunitário tipo B programa de aceleração do crescimento PAC – Ministério do Esporte (CONVENIO Nº 980416/2025)**, no município de chapadinha.

São Luís, MA – 24 de JULHO de 2026

THOMPSON
BEZERRA CARNEIRO
SOBRINHO:8452146
5315

Assinado de forma digital
por THOMPSON BEZERRA
CARNEIRO
SOBRINHO:84521465315
Dados: 2026.07.29
12:43:13 -03'00'

THOMPSON BEZERRA CARNEIRO SOBRINHO
SOCIO-PROPRIETARIO
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA



BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO TIPO B PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC) - MINISTÉRIO DO ESPORTE (CONVENIO N° 980416/2025)

2ª (SEGUNDA)
03/07/2026-24/07/2026
24/07/2026NÚMERO DA MEDIÇÃO
PERÍODO
DATA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QNT	PÇ UNITÁRIO C BDI	AC ANTERIOR	QUANTIDADE AC ATUAL	AC TOTAL	AC ANTERIOR	FINANCEIRO AC ATUAL	AC TOTAL	VALOR	SALDO	%
1			CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICO												
1.1			FUNDAÇÃO												
1.1.1	97082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER, AF. 09/2021	M3	32,50	R\$ 75,59	R\$ 2.456,68	32,50		R\$ 2.456,68	R\$ -	R\$ 2.456,68	R\$ -	0,00%	
1.1.2	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA, AF. 09/2021	M2	130,00	R\$ 0,82	R\$ 106,60	130,00		R\$ 106,60	R\$ -	R\$ 106,60	R\$ -	0,00%	
1.1.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM, AF. 01/2024	M2	78,00	R\$ 43,87	R\$ 3.421,86	78,00		R\$ 3.421,86	R\$ -	R\$ 3.421,86	R\$ -	0,00%	
1.1.4	89470	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO, AF. 10/2022	M2	64,00	R\$ 110,36	R\$ 7.063,04	64,00		R\$ 7.063,04	R\$ -	R\$ 7.063,04	R\$ -	0,00%	
1.2			PAVIMENTAÇÃO												
1.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF. 11/2019	M2	1.500,00	R\$ 3,09	R\$ 4.635,00	0,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.635,00	100,00%	
1.2.2	C 001	COMP. PRÓPRIAS	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM	M3	140,00	R\$ 164,16	R\$ 22.982,40	0,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.982,40	100,00%	
1.2.3	C 002	COMP. PRÓPRIAS	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM	M3	70,00	R\$ 190,32	R\$ 13.322,40	0,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.322,40	100,00%	
1.2.4	C 003	COMP. PRÓPRIAS	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM	M3	70,00	R\$ 190,32	R\$ 13.322,40	0,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.322,40	100,00%	
1.2.5	C 004	COMP. PRÓPRIAS	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	1.400,00	R\$ 214,69	R\$ 300.566,00	0,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.566,00	100,00%	
1.2.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM, AF. 01/2024	M2	99,00	R\$ 43,87	R\$ 4.343,13	0,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.343,13	100,00%	
1.2.7	C 008	COMP. PRÓPRIAS	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM	M2	99,00	R\$ 234,10	R\$ 23.175,90	0,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.175,90	100,00%	
1.3			ESTRUTURA												
1.3.1	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 01/2024	M2	80,60	R\$ 122,53	R\$ 9.875,92	80,60		R\$ 9.875,92	R\$ -	R\$ 9.875,92	R\$ -	0,00%	
1.3.2	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF. 01/2024	KG	124,00	R\$ 23,62	R\$ 2.928,88	124,00		R\$ 2.928,88	R\$ -	R\$ 2.928,88	R\$ -	0,00%	
1.3.3	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF. 01/2024	KG	280,20	R\$ 19,24	R\$ 5.391,05	280,20		R\$ 5.391,05	R\$ -	R\$ 5.391,05	R\$ -	0,00%	
1.3.4	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 01/2024	M3	6,05	R\$ 928,99	R\$ 5.620,39	6,05		R\$ 5.620,39	R\$ -	R\$ 5.620,39	R\$ -	0,00%	
1.3.5	C 007	COMP. PRÓPRIAS	ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"	M	60,00	R\$ 194,82	R\$ 11.689,20	60,00		R\$ 11.689,20	R\$ -	R\$ 11.689,20	R\$ -	0,00%	
1.4			ALVENARIA E FECHAMENTO												
1.4.1	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF. 12/2021	M2	80,00	R\$ 97,01	R\$ 7.760,80	0,00	80,00	R\$ -	R\$ 7.760,80	R\$ 7.760,80	R\$ -	0,00%	

1.4.2	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA), AF. 03/2021	M2	683,55	R\$	213,74	R\$	146.101,98	0,00	683,55	683,55	R\$	-	R\$	146.101,98	R\$	146.101,98	R\$	-	0,00%
1.5			REVESTIMENTO																		
1.5.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 10/2022	M2	160,00	R\$	6,02	R\$	963,20	0,00			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	963,20	R\$	100,00%
1.5.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2014	M2	160,00	R\$	52,01	R\$	8.321,60	0,00			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	8.321,60	R\$	100,00%
1.6			PINTURA																		
1.6.1	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF. 04/2023	M2	160,00	R\$	14,23	R\$	2.276,80	0,00			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.276,80	R\$	100,00%
1.6.2	100750	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF. 01/2020	M2	888,00	R\$	29,99	R\$	26.631,12	0,00			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	26.631,12	R\$	100,00%
1.7			EQUIPAMENTOS																		
1.7.1	C-005	COMP. PRÓPRIAS	CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	5.281,21	R\$	5.281,21	0,00			0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	5.281,21	R\$	100,00%
2			MEIA QUADRA DE BASQUETE																		
2.1			FUNDAÇÃO																		
2.1.1	97082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER, AF. 09/2021	M3	10,50	R\$	75,59	R\$	793,70	0,00			10,50	10,50	R\$	-	R\$	793,70	R\$	-	0,00%
2.1.2	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA, AF. 09/2021	M2	30,00	R\$	0,82	R\$	24,60	0,00			30,00	30,00	R\$	-	R\$	24,60	R\$	24,60	0,00%
2.1.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM, AF. 01/2024	M2	0,00	R\$	43,87	R\$	-	0,00			0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!
2.1.4	89470	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPa, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO, AF. 10/2022	M2	24,00	R\$	110,36	R\$	2.648,64	0,00			24,00	24,00	R\$	-	R\$	2.648,64	R\$	2.648,64	0,00%
2.2			PAVIMENTAÇÃO																		
2.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF. 11/2019	M2	221,00	R\$	3,09	R\$	682,89	0,00			0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	682,89	100,00%
2.2.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM, AF. 01/2024	M2	221,00	R\$	43,87	R\$	9.695,27	0,00			0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	9.695,27	100,00%
2.2.3	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF. 08/2022	M2	221,00	R\$	122,97	R\$	27.176,37	0,00			0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	27.176,37	100,00%
2.2.4	INS-94696446	COMP. PRÓPRIAS	PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	161.842,70	R\$	161.842,70	0,00			0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	161.842,70	100,00%
2.3			EQUIPAMENTOS																		
2.3.1	C 006	COMP. PRÓPRIAS	TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	4.863,00	R\$	4.863,00	0,00			0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	4.863,00	100,00%
3			PARQUINHO INFANTIL																		
3.1			FUNDAÇÃO																		
3.1.1	97082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER, AF. 09/2021	M3	8,75	R\$	75,59	R\$	661,41	8,75			8,75	8,75	R\$	-	R\$	-	R\$	661,41	0,00%
3.1.2	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA, AF. 09/2021	M2	25,00	R\$	0,82	R\$	20,50	25,00			25,00	25,00	R\$	-	R\$	-	R\$	20,50	0,00%

3.1.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS. LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF_ 01/2024	M2	15,00	R\$	43,87	R\$	658,05	15,00		15,00	R\$	658,05	R\$	-	R\$	658,05	R\$	-	0,00%
3.1.4	89470	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_ 10/2022	M2	20,00	R\$	110,36	R\$	2.207,20	20,00		20,00	R\$	2.207,20	R\$	-	R\$	2.207,20	R\$	-	0,00%
3.2			PAVIMENTAÇÃO																		
3.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_ 11/2019	M2	142,85	R\$	3,09	R\$	441,41	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	441,41	100,00%
3.2.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS. LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF_ 01/2024	M2	142,85	R\$	43,87	R\$	6.266,83	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.266,83	100,00%
3.2.3	87702	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 6CM. AF_ 07/2021	M2	142,85	R\$	75,41	R\$	10.772,32	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	10.772,32	100,00%
3.2.4	101735	SINAPI	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_ 09/2020	M2	142,85	R\$	551,27	R\$	78.748,92	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	78.748,92	100,00%
3.3			EQUIPAMENTOS																		
3.3.1	COT 001	COMP. PRÓPRIAS	PARDE ESCALADA (2,00 X 1,80M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UND	2,00	R\$	7.396,55	R\$	14.793,10	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	14.793,10	100,00%
3.3.2	COT 002	COMP. PRÓPRIAS	GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UND	1,00	R\$	4.669,59	R\$	4.669,59	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.669,59	100,00%
3.3.3	COT 003	COMP. PRÓPRIAS	BRINQUEDO (4,00 X 5,00M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M220 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR	UND	1,00	R\$	31.143,41	R\$	31.143,41	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	31.143,41	100,00%
3.3.4	COT 006	COMP. PRÓPRIAS	GESTO DE LIXO (0,60 X 0,60M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UND	1,00	R\$	3.503,63	R\$	3.503,63	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.503,63	100,00%
3.3.5	COT 004	COMP. PRÓPRIAS	BANCO FIXO (0,70 X 1,50M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UND	6,00	R\$	1.849,14	R\$	11.094,84	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	11.094,84	100,00%
4			PISTA DE CAMINHADA																		
4.1			PAVIMENTAÇÃO																		
4.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_ 11/2019	M2	643,89	R\$	3,09	R\$	1.989,62	643,89		643,89	R\$	1.989,62	R\$	-	R\$	1.989,62	R\$	-	0,00%
4.1.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS. LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF_ 01/2024	M2	643,89	R\$	43,87	R\$	28.247,45	643,89		643,89	R\$	28.247,45	R\$	-	R\$	28.247,45	R\$	-	0,00%
4.1.3	94984	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_ 08/2022	M2	643,89	R\$	122,97	R\$	79.179,15	643,89		643,89	R\$	79.179,15	R\$	-	R\$	79.179,15	R\$	-	0,00%
4.2			PINTURA																		
4.2.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_ 05/2021	M2	643,89	R\$	74,41	R\$	47.911,85	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	47.911,85	100,00%
4.2.2	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_ 05/2021	M	214,72	R\$	13,08	R\$	2.808,54	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.808,54	100,00%
5			IMPLANTAÇÃO GERAL																		
5.1			PAVIMENTAÇÃO																		
5.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_ 11/2019	M2	139,86	R\$	3,09	R\$	432,17	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	432,17	100,00%

5.1.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_ 01/2024	M2	139,86	R\$ 43,87	R\$ 6.135,66	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.135,66	100,00%
5.1.3	C 008	COMP. PRÓPRIAS	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM	M2	139,86	R\$ 234,10	R\$ 32.741,23	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.741,23	100,00%
5.1.4	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 38X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_ 01/2024	M	160,90	R\$ 66,38	R\$ 10.680,54	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.680,54	100,00%
5.1.5	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURTIBIANA, EM PLACAS. AF_ 05/2022	M2	267,03	R\$ 27,88	R\$ 7.444,80	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.444,80	100,00%
5.2			URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO												
5.2.1	COT 004	COMP. PRÓPRIAS	BANCO FIXO (0,70 X 1,50M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO. REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UND	6,00	R\$ 1.849,14	R\$ 11.094,84	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.094,84	100,00%
5.2.2	COT 005	COMP. PRÓPRIAS	CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO. REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UND	16,00	R\$ 1.167,88	R\$ 18.686,08	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.686,08	100,00%
5.2.3	COT 007	COMP. PRÓPRIAS	BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO. REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UND	4,00	R\$ 4.282,22	R\$ 17.128,88	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.128,88	100,00%
5.2.4	COT 008	COMP. PRÓPRIAS	CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00M) E 2 BANCOS (0,30 X 2,00M) EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UND	2,00	R\$ 7.396,55	R\$ 14.793,10	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.793,10	100,00%
5.2.5	103315	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_ 11/2021	M2	11,75	R\$ 353,31	R\$ 4.151,39	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.151,39	100,00%
5.2.6	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_ 05/2018	UN	30,00	R\$ 104,73	R\$ 3.141,90	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.141,90	100,00%
5.2.7	98510	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_ 05/2018	UN	24,00	R\$ 144,84	R\$ 3.476,16	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.476,16	100,00%
5.2.8	98511	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_ 05/2018	UN	2,00	R\$ 282,69	R\$ 565,38	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 565,38	100,00%
5.3			INSTALAÇÃO ELÉTRICA												
5.3.1	C 011	COMP. PRÓPRIAS	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	145,00	R\$ 32,63	R\$ 4.731,35	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.731,35	100,00%
5.3.2	C 012	COMP. PRÓPRIAS	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70,00	R\$ 12,07	R\$ 844,90	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 844,90	100,00%
5.3.3	C 013	COMP. PRÓPRIAS	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	R\$ 17,19	R\$ 3.438,00	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.438,00	100,00%
5.3.4	C 014	COMP. PRÓPRIAS	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00	R\$ 58,67	R\$ 352,02	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 352,02	100,00%
5.3.5	C 015	COMP. PRÓPRIAS	CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00	R\$ 28,70	R\$ 258,30	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 258,30	100,00%
5.3.6	C 016	COMP. PRÓPRIAS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	205,00	R\$ 5,73	R\$ 1.174,65	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.174,65	100,00%
5.3.7	C 018	COMP. PRÓPRIAS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	530,00	R\$ 11,88	R\$ 6.296,40	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.296,40	100,00%
5.3.8	C 019	COMP. PRÓPRIAS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.280,00	R\$ 16,04	R\$ 20.210,40	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.210,40	100,00%
5.3.9	C 020	COMP. PRÓPRIAS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	R\$ 25,34	R\$ 506,80	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 506,80	100,00%

5.3.10	C 021	COMP. PRÓPRIAS	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	R\$	29,86	R\$	238,88	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	238,88	100,00%
5.3.11	C 022	COMP. PRÓPRIAS	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00	R\$	39,59	R\$	356,31	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	356,31	100,00%
5.3.12	C 023	COMP. PRÓPRIAS	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	R\$	56,06	R\$	168,18	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	168,18	100,00%
5.3.13	C 024	COMP. PRÓPRIAS	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)	UND	1,00	R\$	4.867,31	R\$	4.867,31	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.867,31	100,00%
5.3.14	C 025	COMP. PRÓPRIAS	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	631,58	R\$	631,58	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	631,58	100,00%
5.3.15	C 026	COMP. PRÓPRIAS	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	R\$	14,28	R\$	42,84	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	42,84	100,00%
5.3.16	C 027	COMP. PRÓPRIAS	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	54,99	R\$	54,99	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	54,99	100,00%
5.3.17	C 028	COMP. PRÓPRIAS	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	93,55	R\$	93,55	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	93,55	100,00%
5.3.18	C 029	COMP. PRÓPRIAS	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	R\$	126,92	R\$	507,68	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	507,68	100,00%
5.3.19	C 030	COMP. PRÓPRIAS	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	19,00	R\$	106,29	R\$	2.019,51	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.019,51	100,00%
5.3.20	C 031	COMP. PRÓPRIAS	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	R\$	186,52	R\$	932,60	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	932,60	100,00%
5.3.21	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO CIRCULAR EM POLETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF - 12/2020	UN	5,00	R\$	68,57	R\$	342,85	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	342,85	100,00%
5.3.22	C 032	COMP. PRÓPRIAS	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	R\$	1,21	R\$	9,68	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	9,68	100,00%

5.3.23	C 033	COMP. PRÓPRIAS	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM LED 100W DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	16,00	R\$	17,99	R\$	287,84	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	287,84	100,00%	
5.3.24	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30X0,3 M. AF. 12/2020	UN	13,00	R\$	205,10	R\$	2.666,30	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.666,30	100,00%	
5.3.25	C 034	COMP. PRÓPRIAS	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	R\$	3.434,36	R\$	20.606,16	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	20.606,16	100,00%	
5.3.26	C 035	COMP. PRÓPRIAS	POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$	4.725,21	R\$	9.450,42	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	9.450,42	100,00%	
5.4			INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS																	
5.4.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	66,00	R\$	27,54	R\$	1.817,64	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.817,64	100,00%	
5.4.2	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	21,00	R\$	38,19	R\$	801,99	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	801,99	100,00%	
5.4.3	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	4,00	R\$	10,69	R\$	42,76	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	42,76	100,00%	
5.4.4	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	3,00	R\$	19,25	R\$	57,75	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	57,75	100,00%	
5.4.5	89364	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00	R\$	13,56	R\$	13,56	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	13,56	100,00%	
5.4.6	89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	2,00	R\$	23,11	R\$	46,22	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	46,22	100,00%	
5.4.7	89380	SINAPI	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	2,00	R\$	11,56	R\$	23,12	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	23,12	100,00%	
5.4.8	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	3,00	R\$	82,40	R\$	247,20	0,00		0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	247,20	100,00%	
5.5			DRENAGEM																	
5.5.1	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	M	39,00	R\$	55,79	R\$	2.175,81	0,00	39,00	39,00	R\$	2.175,81	R\$	2.175,81	R\$	-	0,00%	
5.5.2	102711	SINAPI	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2021	UN	10,00	R\$	89,25	R\$	892,50	0,00	10,00	10,00	R\$	892,50	R\$	892,50	R\$	-	0,00%	
5.5.3	C 009	COMP. PRÓPRIAS	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,20 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES	UND	2,00	R\$	1.034,70	R\$	2.069,39	0,00	2,00	2,00	R\$	2.069,39	R\$	2.069,39	R\$	-	0,00%	
5.5.4	C 010	COMP. PRÓPRIAS	COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES	M	360,00	R\$	94,39	R\$	33.980,40	0,00	360,00	360,00	R\$	33.980,40	R\$	33.980,40	R\$	-	0,00%	
5.6			SERVIÇOS COMPLEMENTARES																	
5.6.1	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3	450,00	R\$	10,85	R\$	4.882,50	0,00	450,00	450,00	R\$	4.882,50	R\$	4.882,50	R\$	-	0,00%	
5.6.2	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	4.500,00	R\$	2,29	R\$	10.305,00	0,00	4.500,00	4.500,00	R\$	10.305,00	R\$	10.305,00	R\$	-	0,00%	
VALOR ORÇAMENTO C BDI:										R\$	1.430.000,00		R\$	161.517,00	R\$	211.635,31	R\$	373.152,31	R\$	1.056.847,69

IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO O VALOR R\$ 211.635,31 (DUZENTOS E ONZE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

SÃO LUIS, MA 24 DE JULHO 2026

VINICIUS ALMEIDA		Assinado de forma digital por VINICIUS ALMEIDA VERAS:042309533
13		124316-0300
VINICIUS ALMEIDA VERAS		ENGENHEIRO CIVIL CREA 11150263-5



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Nº OPERAÇÃO
1102319-56

Nº TransfereGOV
980416/2025

PROPOSTANTE TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

PERÍODO
2

PERÍODO
03/07/2026 a 24/07/2024

PERÍODO
2

NOME DA EMPRESA
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO
03/07/2026 a 24/07/2024

PERÍODO
03/07/2026 a 24/07/2024

Nº CTEF
017/2026

% Realizado Acum.:
26,09%

% Realizado Período.:
14,80%

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº do Evento		Título dos Eventos	
1	1	Administração Local	
2	2	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	
3	3	MEIA QUADRA DE BASQUETE	
4	4	PARQUINHO INFANTIL	
5	5	PISTA DE CAMINHADA	
6	6	IMPLANTAÇÃO GERAL	

Nº do Evento		Título dos Eventos	
1	1	Administração Local	
2	2	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	
3	3	MEIA QUADRA DE BASQUETE	
4	4	PARQUINHO INFANTIL	
5	5	PISTA DE CAMINHADA	
6	6	IMPLANTAÇÃO GERAL	

Nº do Evento		Título dos Eventos	
1	1	Administração Local	
2	2	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	
3	3	MEIA QUADRA DE BASQUETE	
4	4	PARQUINHO INFANTIL	
5	5	PISTA DE CAMINHADA	
6	6	IMPLANTAÇÃO GERAL	

CHAPADINHA-MA

Local

sexta-feira, 24 de julho de 2026

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: EDVALDO PAZ NUNES

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 110.313.774-3

ART/IRR: MA20261027124

Documento assinado digitalmente
EDVALDO PAZ NUNES
Data: 24/07/2026 11:17:39-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>





REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 017/2026

Medição: Segunda

ESPAÇO ESPORTIVO ESPLANADA



EXECUÇÃO COMPACTAÇÃO

VINICIUS ALMEIDA
VERAS:042309533
13

Assinado de forma digital
por VINICIUS ALMEIDA
VERAS:04230953313
Dados: 2026.07.29
12:47:49 -03'00'



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 017/2026

Medição: Segunda

ESPAÇO ESPORTIVO ESPLANADA



EXECUÇÃO COMPACTAÇÃO



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 017/2026

Medição: Segunda

ESPAÇO ESPORTIVO ESPLANADA



EXECUÇÃO COMPACTAÇÃO



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 017/2026

Medição: Segunda

ESPAÇO ESPORTIVO ESPLANADA



EXECUÇÃO TERRAPLANAGEM



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 017/2026

Medição: Segunda

ESPAÇO ESPORTIVO ESPLANADA



EXECUÇÃO COMPACTAÇÃO

[Handwritten signature]



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 017/2026

Medição: Segunda

ESPAÇO ESPORTIVO ESPLANADA



EXECUÇÃO ALAMBRADO



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 017/2026

Medição: Segunda

ESPAÇO ESPORTIVO ESPLANADA



EXECUÇÃO TERRAPLANAGEM

Handwritten signature or initials in blue ink.



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 017/2026

Medição: Segunda

ESPAÇO ESPORTIVO ESPLANADA



EXECUÇÃO PISTA DE CAMINHADA/ALAMBRADO

Handwritten signature or mark in blue ink.



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 017/2026

Medição: Segunda

ESPAÇO ESPORTIVO ESPLANADA



EXECUÇÃO ALAMBRADO

[Handwritten signature]



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 017/2026

Medição: Segunda

ESPAÇO ESPORTIVO ESPLANADA



EXECUÇÃO ALAMBRADO

[Handwritten signature]



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 017/2026

Medição: Segunda

ESPAÇO ESPORTIVO ESPLANADA



EXECUÇÃO DRENAGEM

37.




REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 017/2026

Medição: Segunda

ESPAÇO ESPORTIVO ESPLANADA

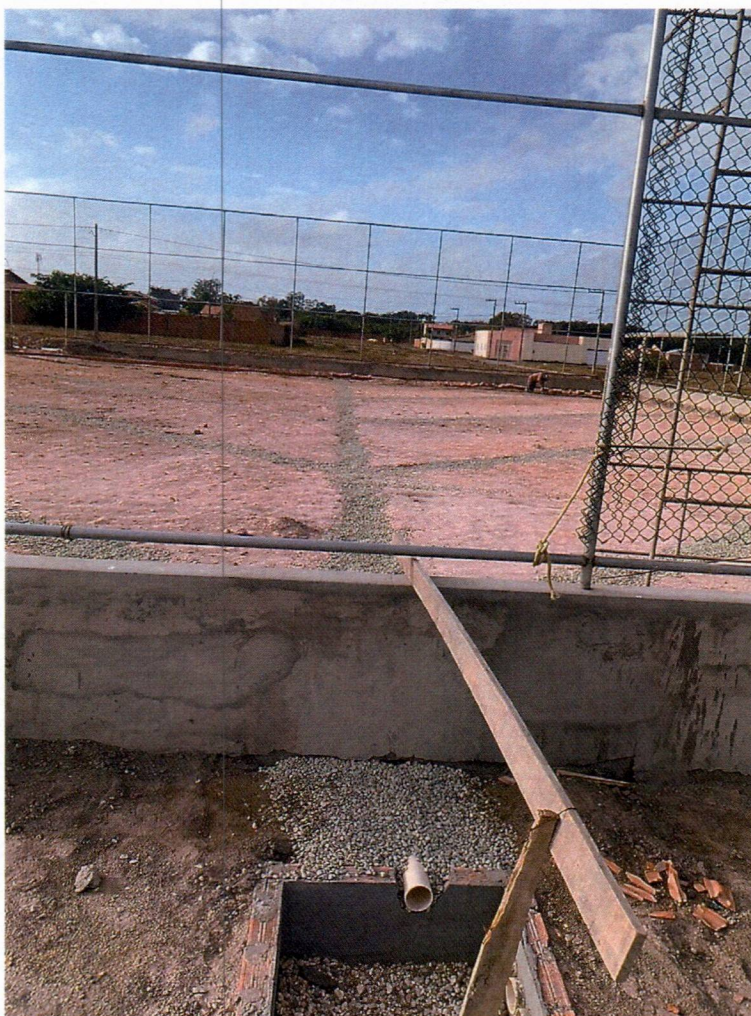

EXECUÇÃO DRENAGEM

VINICIUS
ALMEIDA
VERAS:04230953
313

Assinado de forma
digital por VINICIUS
ALMEIDA
VERAS:04230953313
Dados: 2025.07.29
12:48:06 -03'00'



A Sra.

**Sr. Raimundo Peres da Silva Filho
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CHAPADINHA-MA**

REF.: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na **Rua Das Juçaras, Cond Executive Lake, Número 3, Sala 402, Renascença, São Luís – MA, CEP 65.075 – 230** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **00.513.233/0001 – 98**, , através da sua sócia proprietária **THOMPSON BEZERRA CARNEIRO SOBRINHO**, CPF **845.214.653-15**, RG **888297980**, vem solicitar através deste solicitar da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, MARANHÃO** o valor de **R\$ 211.635,31 (DUZENTOS E ONZE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)** referente a **construção do espaço esportivo comunitário tipo B programa de aceleração do crescimento PAC – Ministerio do Esporte (CONVENIO Nº 980416/2025)**, no município de chapadinha.

DADOS PARA PAGAMENTO:

**Agencia: 4223-0
Conta Corrente: 50.835-7
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
BANCO DO BRASIL**

São Luís, MA - 27 de JULHO de 2026

THOMPSON
BEZERRA
CARNEIRO
SOBRINHO:8452
1465315

Assinado de forma
digital por THOMPSON
BEZERRA CARNEIRO
SOBRINHO:8452146531
5
Dados: 2026.07.29
12:42:42 -03'00'

**THOMPSON BEZERRA CARNEIRO SOBRINHO
SOCIO-PROPRIETARIO
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**

Rua das Juçaras, 03, Cond Executive Lake, Sala 402 – Renascença
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98 CEP: 65.075-230 · Tel.: (98) 98407 - 7992
Email: biapdiniz@gmail.com

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00000092

Data e Hora da Emissão

27/07/2026 11:11:13

Competência da NFS-e

07/2026

Código de Verificação

E6B2.6C38.34BF.8541.1D9C.A977.E652.ACCB**CERTIFICADO**
1020260092112806**Chave de Acesso da NFS-e****2111300120051323300019800000000009226077056662544****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**CPF / CNPJ: **00.513.233/0001-98**Inscrição Municipal: **550000**Endereço: **R DAS JUCARAS, COND:EXECUTIVE LAKE CENTER, COND:EXECUTIVE LAKE, 3 - BAIRRO RENASCENÇA - CEP:**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **direcao@idealconstrutorama.**Telefone: **(98) 88373415****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **MUNICIPIO DE CHAPADINHA**CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AV PRESIDENTE VARGAS, 310 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65500000**Município: **CHAPADINHA**UF: **MA**Email: **nickmacklewre@gmail.com**Telefone: **(98) 91660182****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: SEGUNDA MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITARIO, NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA - MA - CR MESP 980416/2025 - OPERAÇÃO 1102319-56. DADOS BANCARIOS:
AGENCIA: 4323 - 0
CONTA: 50.835-7
BANCO DO BRASIL

VALOR DA NF.: R\$ R\$ 211.635,31

ATESTO QUE:

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	VALOR DOS SERVIÇOS.	1	126.981,19	126.981,19
TRIBUTÁVEL	VALOR DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.	1	84.654,12	84.654,12

☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
EM 27 / 07 / 2026

Advaldo Paz Nunes
CREANAC 110.313.774-3
engenheiro Civil

PIS (0,00%):

R\$ 0,00

COFINS (0,00%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (1,2000%):

R\$ 2.539,62

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

IBS MUNICIPAL (0,00%):

R\$ 0,00

IBS ESTADUAL (0,05%):

R\$ 100,53

CBS (0,45%):

R\$ 904,74**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 211.635,31**

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211.635,31	5,00%	R\$ 10.581,77

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação
Local de Prestação do Serviço: **CHAPADINHA / MA**
Recolhimento: **RETIDO**
Atividade: **421380000 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS**

NBS: **101028000 - Serviços de construção de instalações para recreação e atividades**
Serviço: **070202 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,**
Mês de

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO**

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.513.233/0001-98
Razão social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: R DAS JUCARAS 3 / RENASCENCA / SAO LUIS / MA / 65075-230

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/07/2026 a 04/08/2026

Certificação Número: 2026070602130036292078

Informação obtida em 17/07/2026 12:27:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.513.233/0001-98
Certidão nº: 9922119/2026
Expedição: 12/02/2026, às 13:50:21
Validade: 11/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.513.233/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:05:53 do dia 26/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/11/2026.

Código de controle da certidão: **5085.643C.6C55.40FE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 056716/26

Data da

03/06/2026 10:57:42

Inscrição Estadual: 127598723

CPF/CNPJ: 00513233000198

Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA DAS JUCARAS COND:EXECUTIVE LAKE CENTER COND:EXECUTIVE LAKE,

Telefone: (98)88373415

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 01/09/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/06/2026 14:27:53



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 138472/26

Data da

03/06/2026 10:56:16

Inscrição Estadual: 127598723

CPF/CNPJ: 00513233000198

Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA DAS JUCARAS COND:EXECUTIVE LAKE CENTER COND:EXECUTIVE LAKE,

Telefone: (98)88373415

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 01/09/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/06/2026 14:26:47



CERTIFICADO

1020260092198722



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00014117912026

Validade: 02/01/2027

Certificamos que, verificando os registros da secretaria municipal da fazenda, constatamos existir, nesta data, pendências cadastradas na inscrição da pessoa jurídica descrita abaixo, as quais estão com exigibilidade suspensa, conforme o disposto no artigo 151 do ctn e nos artigos 80 e 81, da lei 6.289, de 28/12/2017, ressalvado o direito de a fazenda pública municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA		
CNPJ: 00.513.233/0001-98		Inscrição Municipal: 550000
Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA		
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL		
412040000 – CONSTRUCAO DE EDIFICIOS		
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO		
Logradouro: RUA DAS JUCARAS, COND:EXECUTIVE LAKE CENTER, COND:EXECUTIVE LAKE		
Número: 3		Complemento:
Bairro: RENASCENCA		
Município: SAO LUIS – MA		CEP: 65075230

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **06 de julho de 2026 as 14:00**, sob o código de autenticidade nº **CED6485EB1F6AABC0C0D9D0D2D636986**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."
