

OFICIO Nº 301/2026 - GAB. SINURB

Chapadina MA, 08 de julho de 2026

Ao Senhor
Alex Monteiro Castelo Branco
Secretário Municipal de Saúde.

Assunto: Processo para pagamento da 1ª medição do 1º termo aditivo dos serviços de construção de sistema simplificado de abastecimento de água no Povoado Cobra/Ladeira, no município de Chapadina/MA, executados pela Empresa SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA.

Senhor Secretário,

Com os cumprimentos iniciais, aproveitamos do expediente, para encaminhar em anexo processo para análise e posterior deliberação do pagamento da **1ª Medição** do 1º termo aditivo dos serviços executados pela empresa **SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**, sob CNPJ nº 69.391.274/0001-55, referente à execução de serviços de **construção de sistema simplificado de abastecimento de água no Povoado Cobra/Ladeira**, no município de Chapadina-MA, conforme:

Contrato nº 197/2025,

Processo nº 5024/2024,

Concorrência nº 032/2024,

NF nº 577,

Valor R\$ 107.999,84

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos ao passo que renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

OFÍCIO

26 DE JUNHO DE 2026

A SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA, inscrita no CNPJ 69.391.274/0001-55, sediada na Rua Renato Viana, 110, Ivar Saldanha, em São Luís – MA, CEP 65.036-000, por intermédio do seu representante legal Sr. PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER, portador do CPF 032.978.163-41, detentora do contrato de **Nº 197/2025**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, solicitar a **Primeira Medição** referente a construção de um sistema simplificado de abastecimento no povoado COBRA/LADEIRA.

DADOS BANCÁRIOS

Agência: 4325 Conta: 13003541-3

Instituição: 033 – Santander

Nome da Empresa: SF Engenharia E Arquitetura LTDA

CNPJ: 69.391.274/0001-55

Atenciosamente,



Pedro Sereno M. Scriviner
Engenheiro Civil
CREA 113326271
Responsável Técnico

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

PEDRO SCRIVINER

CPF: 032.978.163-41

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
RUA RENATO VIANA, N 110, IVAR SALDANHA, SÃO LUIS MA
CNPJ: 69.391.274/0001-55


SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

Ao Senhor
Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário de Infraestrutura e Urbanismo
Chapadinha MA

Prezado Senhor Secretário,

Tendo em vista a execução dos serviços de construção do sistema de abastecimento de água no povoado vereda grande, município de Chapadinha, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Chapadinha MA, conforme, Contrato Nº 197/2025. Estamos solicitando de V. Sr., a confirmação da 1ª medição dos serviços já executados de um sistema simplificado de abastecimento no povoado COBRA/LADEIRA.

Chapadinha - MA, 26 de Junho de 2026



Pedro Sereno M. Scriver
Engenheiro Civil
CREA 11332627-1
Responsável Técnico

Pedro Sereno Moreira Scriver
RG: 016856972001-5
CPF: 032.978.163-41
TITULAR

Nº MEDIÇÃO	PRIMEIRA MEDIÇÃO
LOCAL	COBRALADEIRA
PERÍODO	09/02 A 26/06
DATA	26/06/2026

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QNT	PÇ UNITÁRIO R\$	PÇTOTAL R\$	QUANTIDADE		FINANCEIRO		SALDO			
								AC ANT	AC ATUAL	AC TOTAL	AC ANT	AC ATUAL	AC TOTAL	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1.50 X 2.00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA -REV 02 - 09/2021	ORSE	UN	1,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00		1,00	1,00	R\$ -	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ -	0%
1.2	COMP SSAD 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	COMPOSIÇÕES	MES	6,00	R\$ 5.604,12	R\$ 33.624,72		3,00	3,00	R\$ -	R\$ 16.812,36	R\$ 16.812,36	R\$ 16.812,36	50%
1.3	98524	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	SINAPI	M2	375,00	R\$ 4,56	R\$ 1.710,00		375,00	375,00	R\$ -	R\$ 1.710,00	R\$ 1.710,00	R\$ -	0%
2	CAPTAÇÃO														
2.1	CANTEIRO DE POÇOS														
2.1.1	COMP SSAD 02	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	COMPOSIÇÕES	KM	45,00	R\$ 17,11	R\$ 769,95		45,00	45,00	R\$ -	R\$ 769,95	R\$ 769,95	R\$ -	0%
2.1.2	240201	ABRIGO PROVISÓRIO E NIVELAMENTO DA PERFURATRIZ	CAEAMA	UN	1,00	R\$ 308,83	R\$ 308,83		1,00	1,00	R\$ -	R\$ 308,83	R\$ 308,83	R\$ -	0%
2.1.3	240204	ESCOVAÇÃO DOS TANQUES E CANALETAS DE LAMA	CAEAMA	M3	9,24	R\$ 97,99	R\$ 905,43		9,24	9,24	R\$ -	R\$ 905,43	R\$ 905,43	R\$ -	0%
2.1.4	S05088	BARRAÇÃO PARA OBRAS DE MEDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	ORSE	M2	25,00	R\$ 231,50	R\$ 5.787,50		25,00	25,00	R\$ -	R\$ 5.787,50	R\$ 5.787,50	R\$ -	0%
2.2	PERFURAÇÃO														
2.2.1	240312	PERF. 8" EM SEDIMENTO (DE 0 A 50 M.)	CAEAMA	M	50,00	R\$ 76,35	R\$ 3.817,50		50,00	50,00	R\$ -	R\$ 3.817,50	R\$ 3.817,50	R\$ -	0%
2.2.2	240324	PERF. 8" EM SEDIMENTO (DE 50 A 100 M.)	CAEAMA	M	50,00	R\$ 80,16	R\$ 4.008,00		50,00	50,00	R\$ -	R\$ 4.008,00	R\$ 4.008,00	R\$ -	0%
2.2.3	240335	PERF. 8" EM SEDIMENTO (DE 100 A 150 M.)	CAEAMA	M	20,00	R\$ 88,17	R\$ 1.763,40		20,00	20,00	R\$ -	R\$ 1.763,40	R\$ 1.763,40	R\$ -	0%
2.2.4	240309	REABERTURA DA PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO NO DIÂMETRO DE 14" (DE 0 A 50 M.)	CAEAMA	M	50,00	R\$ 131,85	R\$ 6.592,50		50,00	50,00	R\$ -	R\$ 6.592,50	R\$ 6.592,50	R\$ -	0%
2.2.5	240321	REABERTURA DA PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO NO DIÂMETRO DE 14" (DE 50 A 100M)	CAEAMA	M	50,00	R\$ 138,45	R\$ 6.922,50		50,00	50,00	R\$ -	R\$ 6.922,50	R\$ 6.922,50	R\$ -	0%
2.2.6	240332	REABERTURA DA PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO NO DIÂMETRO DE 14" (DE 100 A 150M)	CAEAMA	M	20,00	R\$ 152,31	R\$ 3.046,20		20,00	20,00	R\$ -	R\$ 3.046,20	R\$ 3.046,20	R\$ -	0%
2.3	COMPLEMENTAÇÃO														
2.3.1	240410	INSTALAÇÃO REVESTIMENTO EM PVC	CAEAMA	M	120,00	R\$ 10,81	R\$ 1.297,20		120,00	120,00	R\$ -	R\$ 1.297,20	R\$ 1.297,20	R\$ -	0%
2.3.2	240416	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÉ-FILTRO	CAEAMA	M3	10,00	R\$ 312,23	R\$ 3.122,30		10,00	10,00	R\$ -	R\$ 3.122,30	R\$ 3.122,30	R\$ -	0%
2.3.3	240422	PROTEÇÃO SANITÁRIA	CAEAMA	M3	0,81	R\$ 307,38	R\$ 244,12		0,81	0,81	R\$ -	R\$ 244,12	R\$ 244,12	R\$ -	0%
2.3.4	240425	LIMPEZA COM COMPRESSOR	CAEAMA	H	24,00	R\$ 132,37	R\$ 3.176,88		24,00	24,00	R\$ -	R\$ 3.176,88	R\$ 3.176,88	R\$ -	0%
2.3.5	240434	DESENVOLVIMENTO COM BOMBA	CAEAMA	H	24,00	R\$ 100,19	R\$ 2.404,56		24,00	24,00	R\$ -	R\$ 2.404,56	R\$ 2.404,56	R\$ -	0%
2.3.6	240437	TESTE DE PRODUÇÃO COM BOMBA	CAEAMA	H	12,00	R\$ 100,19	R\$ 1.202,28		12,00	12,00	R\$ -	R\$ 1.202,28	R\$ 1.202,28	R\$ -	0%
2.3.7	240446	DESINFECÇÃO	CAEAMA	M3	8,14	R\$ 46,51	R\$ 378,59		8,14	8,14	R\$ -	R\$ 378,59	R\$ 378,59	R\$ -	0%
2.3.8	240452	CENTRALIZADORES EM AÇO 6" X 14"	CAEAMA	UN	10,00	R\$ 43,13	R\$ 431,30		10,00	10,00	R\$ -	R\$ 431,30	R\$ 431,30	R\$ -	0%
2.4	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA DO POÇO TUBULAR														
2.4.1	240470	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA AS EXPENSAS DO EMPREITEIRO (A MESMA SERÁ ACEITA SE ESTIVER DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM A MATRÍCULA E NOME DO SERVIDOR DA CAEAMA QUE EFETUOU A COLETA)	CAEAMA	UN	1,00	R\$ 571,92	R\$ 571,92		1,00	1,00	R\$ -	R\$ 571,92	R\$ 571,92	R\$ -	0%
2.5	TUBO DE REVESTIMENTO EM PVC														
2.5.1	00009854	TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M	SINAPI	M	84,00	R\$ 110,52	R\$ 9.283,68		84,00	84,00	R\$ -	R\$ 9.283,68	R\$ 9.283,68	R\$ -	0%
2.6	FILTRO EM PVC														
2.6.1	S06269	REVESTIMENTO FILTRO PVC - GEOMECÂNICO STAND DN 154MM	ORSE	M	36,00	R\$ 198,69	R\$ 7.152,84		36,00	36,00	R\$ -	R\$ 7.152,84	R\$ 7.152,84	R\$ -	0%
2.7	CAP EM PVC ATIVADO														
2.7.1	I05117	TAMPA DE FUNDO - CAP FÊMEA GEOMECÂNICO STAND EM 154MM	ORSE	UN	1,00	R\$ 340,49	R\$ 340,49		1,00	1,00	R\$ -	R\$ 340,49	R\$ 340,49	R\$ -	0%
2.7.2	I05124	TAMPA DE POÇO CAP MACHO STAND EM 154MM	ORSE	UN	1,00	R\$ 340,49	R\$ 340,49		1,00	1,00	R\$ -	R\$ 340,49	R\$ 340,49	R\$ -	0%
3	ADUTORIA														
3.1	040102	LOCAÇÃO DE ADUTORIA	CAEAMA	M	15,00	R\$ 1,38	R\$ 20,70		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,70	100%

3.2	S933585	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	ORSE	M3	1,80	R\$ 76,47	R\$ 137,65		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 137,65	100%
3.3	C0096	REATERRO APLOADO	SEINFRA	M3	1,75	R\$ 33,00	R\$ 57,75		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,75	100%
3.4	505206	BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM TRANSPORTE 5KM/ ESPALHAMENTO)	CAEMA	M3	0,04	R\$ 21,78	R\$ 0,87		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,87	100%
3.5	S06465	TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA/ ADUTORA	ORSE	M	15,00	R\$ 0,48	R\$ 7,20		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,20	100%
3.6	89449	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	SINAPI	M	15,00	R\$ 17,22	R\$ 258,30		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 258,30	100%
4	INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS															
4.1	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 179,60	R\$ 179,60		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 179,60	100%
4.2	010198	ESTRUTURA N°1/3 PARA DERIVAÇÃO DE RAMAL AEREO PROVISÓRIO EM ALTA TENSÃO 13,8KV (COM FORNEC. DO POSTE E ACESS, SEM O CABO DA LINHA DE)	CAEMA	UN	1,00	R\$ 3.215,97	R\$ 3.215,97		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.215,97	100%
4.3	170210	CABO DE ALUMÍNIO NU 4AWG PARA LINHA DE TRANSMISSÃO (POR METRO DE LINHA), MONTAGEM E INSTALAÇÃO	CAEMA	M	90,00	R\$ 1,04	R\$ 93,60		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93,60	100%
4.4	170307	ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA, EM BAIXA TENSÃO 380/220V, ATRAVÉS DE RAMAL SUBTERRANEO (SEM O CABO E O ELETRODUTO DO RAMAL) FORNECIMENTO DE MATERIAL DP1703-03 FLS. 01/02/03	CAEMA	UN	1,00	R\$ 559,77	R\$ 559,77		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 559,77	100%
4.5	170319	RAMAL DE SERVIÇO EM BAIXA TENSÃO, TRIFÁSICO EM CABO DE COBRE DE 6MM² (POR METRO DE RAMAL) FORNECIMENTO E MONTAGEM	CAEMA	M	100,00	R\$ 12,04	R\$ 1.204,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.204,00	100%
4.6	COMP SSAD 05	BOMBA SUBMERSÍVEL, MONOFÁSICA (220V), POTÊNCIA = 3,0 CV.	COMPOS IÇÕES	UND	1,00	R\$ 3.407,44	R\$ 3.407,44		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.407,44	100%
4.7	190164	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE PVC ADITIVADO DN=50 MM	CAEMA	M	75,00	R\$ 39,01	R\$ 2.925,75		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.925,75	100%
4.8	190180	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 50, INCLUSIVE VALVULA, REGISTROS E MANÔMETROS	CAEMA	UN	1,00	R\$ 2.951,78	R\$ 2.951,78		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.951,78	100%
5	ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO															
5.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	2,25	R\$ 5,42	R\$ 12,20		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,20	100%
5.2	S933585	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	ORSE	M3	0,72	R\$ 76,47	R\$ 55,06		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,06	100%
5.3	C0095	APLICAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CIMAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	1,44	R\$ 21,37	R\$ 30,77		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,77	100%
5.4	090304	BALDRAME EM ALVENARIA DE PEDRA PRETA BRUTA ARGAMASSADA - TRAÇO 1:7	CAEMA	M3	1,26	R\$ 340,55	R\$ 429,09		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 429,09	100%
5.5	S06457	CONCRETO ARMADO FCK=15MPa FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	ORSE	M3	0,18	R\$ 2.266,43	R\$ 407,96		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 407,96	100%
5.6	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF 12/2021	SINAPI	M2	13,23	R\$ 117,93	R\$ 1.560,21		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.560,21	100%
5.7	93184	VERGAS PRÉ-MOLDADAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESURA DE 20 CM. AF 03/2024	SINAPI	M	1,00	R\$ 27,63	R\$ 27,63		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,63	100%
5.8	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8-3). AF 11/2020 PA	SINAPI	M2	4,00	R\$ 189,07	R\$ 756,28		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 756,28	100%
5.9	S878935	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	ORSE	M2	26,46	R\$ 6,61	R\$ 174,90		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,90	100%
5.10	150402	CHAPISCO EM TETOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	CAEMA	M2	4,00	R\$ 8,23	R\$ 32,92		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,92	100%
5.11	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE, EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	SINAPI	M2	26,46	R\$ 38,10	R\$ 1.008,13		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.008,13	100%
5.12	150411	REBOCO PARA TETOS, CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:8	CAEMA	M2	4,00	R\$ 27,07	R\$ 108,28		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108,28	100%
5.13	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF 04/2023	SINAPI	M2	26,46	R\$ 13,63	R\$ 360,65		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 360,65	100%
5.14	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM, AF 01/2024	SINAPI	M2	1,44	R\$ 34,19	R\$ 49,23		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,23	100%

ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO		ACIUM. ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO		VALOR FINAL		
			QUANT.	P. UNIT C/ BDI	TOTAL	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE E	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M. INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO. INSTALADA - REV 02 - 09/2021	UN	1,00	750,00	750,00	0,00	0,00%		1,00	100,00%		750,00	750,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,00	5.804,12	33.624,72	0,00	0,00%		3,00	50,00%		18.812,36	18.812,36
1.3	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	M2	375,00	4,56	1.710,00	0,00	0,00%		375,00	100,00%		1.710,00	1.710,00
	SUB TOTAL				36.084,72							18.272,36	18.272,36
	TOTAL DO ITEM				36.084,72							18.272,36	18.272,36
2.0 CAPTAÇÃO													
2.1 CANTEIRO DE POÇOS													
2.1	DESLACAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	KM	45,00	17,11	769,95	0,00	0,00%		45,00	100,00%		769,95	769,95
2.2	ABRIGO PROVISÓRIO E NIVELAMENTO DA PERFURATRIZ	UN	1,00	308,83	308,83	0,00	0,00%		1,00	100,00%		308,83	308,83
2.3	ESCAVAÇÃO DOS TANQUES E CANALATAS DE LAMA	M3	9,24	97,99	905,43	0,00	0,00%		9,24	100,00%		905,43	905,43
2.4	BARRAÇÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	M2	25,00	231,50	5.787,50	0,00	0,00%		25,00	100,00%		5.787,50	5.787,50
	SUB TOTAL				7.771,71							7.771,71	7.771,71
	TOTAL DO ITEM				7.771,71							7.771,71	7.771,71
2.2 PERFURAÇÃO													
2.2.1	PERF. 8" EM SEDIMENTO (DE 0 A 50 M.)	M	50,00	76,35	3.817,50	0,00	0,00%		50,00	100,00%		3.817,50	3.817,50
2.2.2	PERF. 8" EM SEDIMENTO (DE 50 A 100 M.)	M	50,00	80,16	4.008,00	0,00	0,00%		50,00	100,00%		4.008,00	4.008,00
2.2.3	PERF. 8" EM SEDIMENTO (DE 100 A 150 M.)	M	20,00	88,17	1.763,40	0,00	0,00%		20,00	100,00%		1.763,40	1.763,40
2.2.4	REABERTURA DA PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO NO DIÂMETRO DE 14" (DE 0 A 50 M.)	M	50,00	131,85	6.592,50	0,00	0,00%		50,00	100,00%		6.592,50	6.592,50
2.2.5	REABERTURA DA PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO NO DIÂMETRO DE 14" (DE 50 A 100M)	M	50,00	138,45	6.922,50	0,00	0,00%		50,00	100,00%		6.922,50	6.922,50
2.2.6	REABERTURA DA PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO NO DIÂMETRO DE 14" (DE 100 A 150M)	M	20,00	152,31	3.046,20	0,00	0,00%		20,00	100,00%		3.046,20	3.046,20
	SUB TOTAL				28.150,10							28.150,10	28.150,10
	TOTAL DO ITEM				28.150,10							28.150,10	28.150,10
2.3 COMPLEMENTAÇÃO													
2.3.1	INSTALAÇÃO REVESTIMENTO EM PVC	M	120,00	10,81	1.297,20	0,00	0,00%		120,00	100,00%		1.297,20	1.297,20
2.3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÉ-FILTRO	M3	10,00	312,23	3.122,30	0,00	0,00%		10,00	100,00%		3.122,30	3.122,30
2.3.3	PROTEÇÃO SANITÁRIA	M3	0,81	301,36	244,12	0,00	0,00%		0,81	100,00%		244,12	244,12
2.3.4	LIMPEZA COM COMPRESSOR	H	24,00	132,37	3.176,88	0,00	0,00%		24,00	100,00%		3.176,88	3.176,88
2.3.5	DESENVOLVIMENTO COM BOMBA	H	24,00	100,19	2.404,56	0,00	0,00%		24,00	100,00%		2.404,56	2.404,56
2.3.6	TESTE DE PRODUÇÃO COM BOMBA	H	12,00	100,19	1.202,28	0,00	0,00%		12,00	100,00%		1.202,28	1.202,28
2.3.7	DESINFECÇÃO	M3	8,14	46,51	378,59	0,00	0,00%		8,14	100,00%		378,59	378,59
2.3.8	CENTRALIZADORES EM AÇO 6" X 14"	UN	10,00	43,13	431,30	0,00	0,00%		10,00	100,00%		431,30	431,30
	SUB TOTAL				12.257,23							12.257,23	12.257,23
	TOTAL DO ITEM				12.257,23							12.257,23	12.257,23
2.4 ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA DO POÇO TUBULAR													
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA ÀS EXPENSAS DO EMPREITEIRO (A MESMA SERÁ ACEITA SE ESTIVER DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM A MATRÍCULA E NOME DO SERVIDOR DA CADEIA QUE EFEITUOU A COLETA).													
2.4.1	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA DO POÇO TUBULAR	UM	1,00	571,92	571,92	0,00	0,00%		1,00	100,00%		571,92	571,92
	SUB TOTAL				571,92							571,92	571,92
	TOTAL DO ITEM				571,92							571,92	571,92
2.5 TUBO DE REVESTIMENTO EM PVC													
2.5.1	TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M	M	84,00	110,52	9.283,68	0,00	0,00%		84,00	100,00%		9.283,68	9.283,68
	SUB TOTAL				9.283,68							9.283,68	9.283,68
	TOTAL DO ITEM				9.283,68							9.283,68	9.283,68
2.6 FILTRO EM PVC													
2.6.1	REVESTIMENTO FILTRO PVC - GEOMECÂNICO STAND DN 154MM	M	36,00	198,60	7.152,24	0,00	0,00%		36,00	100,00%		7.152,24	7.152,24
	SUB TOTAL				7.152,24							7.152,24	7.152,24
	TOTAL DO ITEM				7.152,24							7.152,24	7.152,24
2.7 CAP EM PVC ATIVADO													
2.7.1	TAMPA DE FUNDO - CAP FÊMEA GEOMECÂNICO STAND EM 154MM	UND	1,00	340,49	340,49	0,00	0,00%		1,00	100,00%		340,49	340,49
2.7.2	TAMPA DE POÇO CAP MACHO STAND EM 154MM	UND	1,00	340,49	340,49	0,00	0,00%		1,00	100,00%		340,49	340,49
	SUB TOTAL				680,98							680,98	680,98
	TOTAL DO ITEM				680,98							680,98	680,98
3.0 ADUTORA													
3.1	LOCAÇÃO DE ADUTORA	M	15,00	1,38	20,70	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	M3	1,80	76,47	137,65	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00
3.3	REATERRO APLIADO	M3	1,75	33,00	57,75	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00

13

[illegible]

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

✓

9.1	CERCA COM MOIRÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T", PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2020	M	60,00	119,70	7.182,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	PORTÃO EM BARRAS DE FERRO VERT QUADR 1/2" C/ 12CM, 6 BARRAS HOR 1/2"X3/16" (2 A 2) E QUADRO 78"X14", INCLUSIVE 3 DOBRADIÇAS, FERROLHO PORTA-CADEADO, BATEDOR E CHUMBADORES	M2	6,00	424,76	2.548,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
9.3	PORTÃO EM BARRAS DE FERRO VERT QUADR 1/2" C/ 12CM, 6 BARRAS HOR 1/2"X3/16" (2 A 2) E QUADRO 78"X14", INCLUSIVE 3 DOBRADIÇAS, FERROLHO PORTA-CADEADO, BATEDOR E CHUMBADORES	LN	1,00	723,60	723,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
9.4	PORTÃO EM BARRAS DE FERRO VERT QUADR 1/2" C/ 12CM, 6 BARRAS HOR 1/2"X3/16" (2 A 2) E QUADRO 78"X14", INCLUSIVE 3 DOBRADIÇAS, FERROLHO PORTA-CADEADO, BATEDOR E CHUMBADORES	M2	100,00	2,27	227,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL					10.881,28									
TOTAL DO ITEM					10.881,28									
VALOR TOTAL					296.986,84							83.140,82		83.140,82
VALOR DO BDI (26,90%)					78.823,43							24.856,03		24.856,03
VALOR TOTAL COM BDI					346.792,27					31,14		107.999,84		107.999,84
VALOR TOTAL DO CONTRATO : R\$ 346.792,27 (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)														
VALOR DA 1ª MEDIÇÃO: R\$ 107.999,84 (CENTO E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) CORRESPONDENTE A 31,14% DE EXECUÇÃO														
SALDO DA PROPOSTA (R\$): 238.792,43														


Edvaldo Paz Nunes
CREANAC 110.313.774-3
Mecanheiro Civil

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

CONTRATO: 197/2025

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADO COBRA/LADEIRA

MEDIÇÃO: 1ª (PRIMEIRA MEDIÇÃO)



PERFURAÇÃO DE POÇO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

CONTRATO: 197/2025

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADO COBRA/LADEIRA

MEDIÇÃO: 1ª (PRIMEIRA MEDIÇÃO)



PERFURAÇÃO DE POÇO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

CONTRATO: 197/2025

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADO COBRA/LADEIRA

MEDIÇÃO: 1ª (PRIMEIRA MEDIÇÃO)



PERFURAÇÃO DE POÇO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

CONTRATO: 197/2025

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADO COBRA/LADEIRA

MEDIÇÃO: 1ª (PRIMEIRA MEDIÇÃO)



PERFURAÇÃO DE POÇO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

CONTRATO: 197/2025

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADO COBRA/LADEIRA

MEDIÇÃO: 1ª (PRIMEIRA MEDIÇÃO)



PERFURAÇÃO DE POÇO

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
CNPJ: 69.391.274/0001-55

RELATÓRIO TÉCNICO CONSTRUTIVO DE POÇO TUBULAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

POVOADO LADEIRA

MUNICIPIO: CHAPADINHA ESTADO: MA

P-01 – POVOADO LADEIRA

Responsável Técnico:

Carlos Borromeu de Passos Vale

GEÓLOGO CREA 110219873-0.

ABRIL DE 2026

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
CNPJ: 69.391.274/0001-55

EXECUTADOR: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSTRUTORES LTDA

CNPJ: 69.391.274/0001-55

MUNICÍPIO: CHAPADINHA

ESTADO: MA

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
CNPJ: 69.391.274/0001-55

1-LOCALIZAÇÃO

Localização: Povoado Ladeira, localizado entre os povoados Canto dos Bois e Maceno.

2-ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS

Profundidade 164,00m

Sistema de perfuração: Rotativo

Diâmetro de perfuração: 12 polegadas

Diâmetro de revestimento: 6 polegadas

Posição dos Filtros: 104 a 118,00m / 116 a 124m / 128 a 136m / 140 a 148m / 156 a 160m.


Comentário conclusivos: Vazão 32,32 m³/h

Obs: O poço foi revestido com 33 canos e 8 filtros.

Dos 8 Filtros, 6 Filtros captam agua no intervalo mais arenoso de 104 a 144m

CARLOS
BORROMEU DE
PASSOS
VALE:0868734012
5

Assinado de forma
digital por CARLOS
BORROMEU DE PASSOS
VALE:08687340125
Dados: 2026.05.04
08:22:26 -03'00'

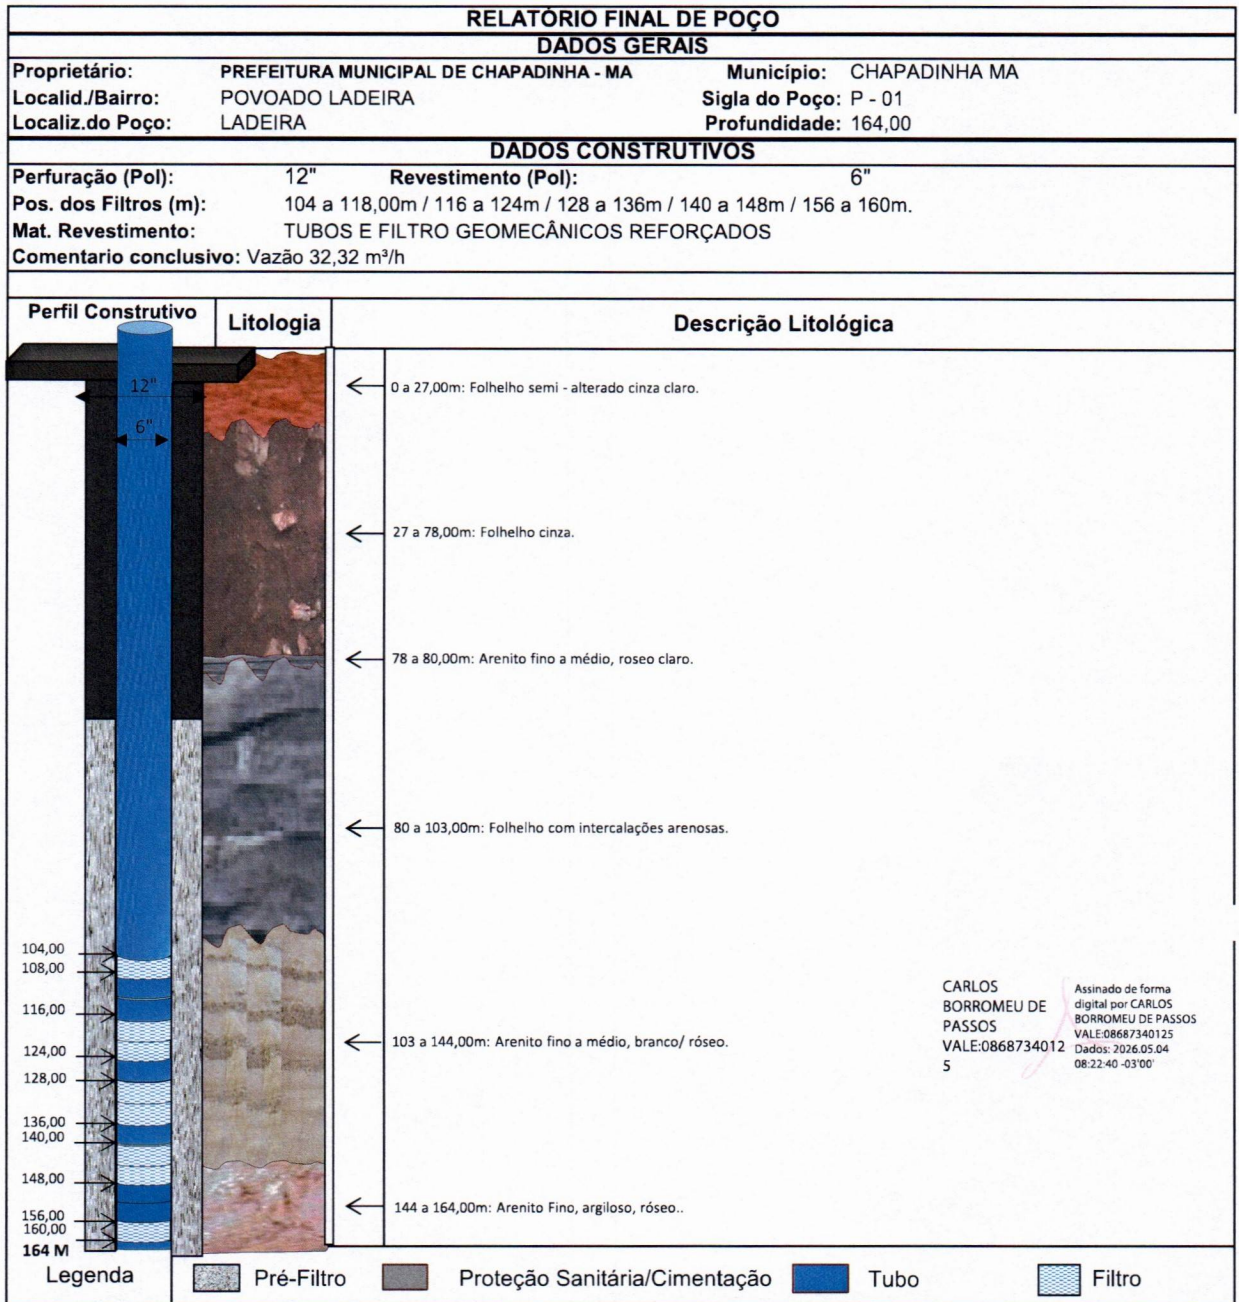

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

R\$ 107.999,84

A SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA, inscrita no CNPJ n ° 69.391.274/0001-55, sediada na Rua Renato Viana, 110, Ivar Saldanha, em São Luís – MA, CEP 65.036-000, por intermédio do seu representante legal Sr. PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER, portador do CPF 032.978.163-41, vem requerer, da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, MARANHÃO**, o valor de **R\$ 107.999,84 (CENTO E SETE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)**, referente à **1ª medição** dos serviços dos serviços de construção de um sistema simplificado de abastecimento no povoado COBRA/LADEIRA no Município de Chapadinha - MA, objeto do contrato 197/2025

Atenciosamente,

São Luís – MA, 06 de Julho de 2026



Pedro Sereno M. Scriviner
Engenheiro Civil
CREA 113326271
Responsável Técnico

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
PEDRO SCRIVINER
CPF: 032.978.163-41

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00000577

Data e Hora da Emissão

06/07/2026 10:26:39

Competência da NFS-e

07/2026

Código de Verificação


ADB1.55B9.F935.7CB7.8278.7AE8.6677.BACA

CERTIFICADO**1020260092198566****Chave de Acesso da NFS-e****2111300126939127400015500000000057726075305291329****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**CPF / CNPJ: **69.391.274/0001-55**Inscrição Municipal: **33515006**Endereço: **R RENATO VIANA, 110, LETRA A - BAIRRO VILA IVAR SALDANHA - CEP: 65036000**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **eletrob@bol.com.br**Telefone: **(98) 88683149****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA**CPF/CNPJ: **11.844.664/0001-53**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R JUSCELINO KUBSTCHEK, SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65500000**Município: **CHAPADINHA**UF: **MA**Email: **dhiankarlo.araujo@gmail.com**Telefone: **(98) 89114087****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADO COBRA/LADEIRA, NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA/MA. CONTRATO 197/2025

		ATESTO QUE:			Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Tipo do Item	Item	☐	OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				
TRIBUTÁVEL	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	☒	OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		1	107.999,84	107.999,84
		EM <u>06</u> / <u>07</u> / <u>2026</u>					
		 CREANAC 110.313.774-3 Engenheiro Civil					

PIS (0,00%): R\$ 0,00	COFINS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,2000%): R\$ 1.296,00
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	IBS MUNICIPAL (0,00%): R\$ 0,00	IBS ESTADUAL (0,05%): R\$ 51,30	CBS (0,45%): R\$ 461,70

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 107.999,84

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 107.999,84	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 5.399,99
--	--	--	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO**

Local de Prestação do Serviço: **CHAPADINHA / MA**

Recolhimento: **RETIDO**

Atividade: **422270100 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO**

NBS: **101034100 - Serviços de perfuração de poços de água**

Serviço: **070202 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,**

Mês de



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 69.391.274/0001-55
Razão social: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
Endereço: R RENATO VIANA 110 LETRA A/ VILA IVAR SALDANHA / SAO LUIS / MA / 65036-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/06/2026 a 13/07/2026

Certificação Número: 2026061402250483711407

Informação obtida em 06/07/2026 10:44:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
CNPJ: 69.391.274/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:25:05 do dia 02/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/11/2026.

Código de controle da certidão: **F4D1.A545.EAF1.8389**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 082193/26

Data da

17/04/2026 11:31:28

Inscrição Estadual: 129242284

CPF/CNPJ: 69391274000155

Razão Social: SF ENGENHARIA-EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Endereço: RUA RENATO VIANA, 110 LETRA A; CEP: 65036000 - VILA IVAR SALDANHA

Telefone: (98)88683149

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 16/07/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 13/05/2026 16:45:49



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 038929/26

Data da

17/04/2026 11:32:04

Inscrição Estadual: 129242284

CPF/CNPJ: 69391274000155

Razão Social: SF ENGENHARIA-EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Endereço: RUA RENATO VIANA, 110 LETRA A; CEP: 65036000 - VILA IVAR SALDANHA

Telefone: (98)88683149

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 16/07/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 13/05/2026 16:46:24



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00013917872026

Validade: 08/10/2026

Certificamos que até a presente data não consta débito fiscal relativo a pessoa jurídica, descrita abaixo, reserva-se o direito de a fazenda municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista nos artigos 80 e 146, da lei 6.289, de 28/12/2017 do código tributário municipal.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 69.391.274/0001-55	Inscrição Municipal: 33515006
Razão Social: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 – CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA RENATO VIANA	
Número: 110	Complemento: LETRA A
Bairro: VILA IVAR SALDANHA	
Município: SÃO LUÍS – MA	CEP: 65036000

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **10 de junho de 2026 as 11:15**, sob o código de autenticidade nº **F07F2D966EDAC28B3FE4258466542C04**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."
