

OFICIO Nº 302/2026 - GAB. SINURB

Chapadinho MA, 08 de julho de 2026

Ao Senhor

Alex Monteiro Castelo Branco

Secretário Municipal de Saúde.

Assunto: Processo para pagamento da 1ª medição do 1º termo aditivo dos serviços de construção de sistema simplificado de abastecimento de água no Povoado Palmeiras, no município de Chapadinho/MA, executados pela Empresa SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA.

Senhor Secretário,

Com os cumprimentos iniciais, aproveitamos do expediente, para encaminhar em anexo processo para análise e posterior deliberação do pagamento da **1ª Medição** do 1º termo aditivo dos serviços executados pela empresa **SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**, sob CNPJ nº 69.391.274/0001-55, referente à execução de serviços de **construção de sistema simplificado de abastecimento de água no Povoado Palmeiras**, no município de Chapadinho-MA, conforme:

Contrato nº 197/2025,

Processo nº 5024/2024,

Concorrência nº 032/2024,

NF nº 578,

Valor R\$ 108.219,37

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos ao passo que renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Recebido anexos 09/07/2026
Travessa Sebastião Barbosa, S/N - Centro, Chapadinho-MA.
Email: seobrasch@gmail.com

OFÍCIO

26 DE JUNHO DE 2026

A SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA, inscrita no CNPJ 69.391.274/0001-55, sediada na Rua Renato Viana, 110, Ivar Saldanha, em São Luís – MA, CEP 65.036-000, por intermédio do seu representante legal Sr. PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER, portador do CPF 032.978.163-41, detentora do contrato de **Nº 197/2025**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, solicitar a **Primeira Medição** referente a construção de um sistema simplificado de abastecimento no povoado Palmeiras.

DADOS BANCÁRIOS

Agência: 4325 Conta: 13003541-3

Instituição: 033 – Santander

Nome da Empresa: SF Engenharia E Arquitetura LTDA

CNPJ: 69.391.274/0001-55

Atenciosamente,



Pedro Sereno M. Scriviner
Engenheiro Civil
CREA 113326271
Responsável Técnico

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

PEDRO SCRIVINER

CPF: 032.978.163-41

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
RUA RENATO VIANA, N 110, IVAR SALDANHA, SÃO LUIS MA
CNPJ: 69.391.274/0001-55

SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

*Ao Senhor
Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário de Infraestrutura e Urbanismo
Chapadinha MA*

Prezado Senhor Secretário,

Tendo em vista a execução dos serviços de construção do sistema de abastecimento de água no povoado vereda grande, município de Chapadinha, de interesse da Secretaria Municipal de Saude de Chapadinha MA, conforme, Contrato Nº 197/2025. Estamos solicitando de V. Sr., a confirmação da 1º medição dos serviços já executados de um sistema simplificado de abastecimento no povoado Palmeiras.

Chapadinha - MA, 26 de Junho de 2026



Pedro Sereno Moreira Scriver
Engenheiro Civil
CREA 11332827-1
Responsável Técnico

Pedro Sereno Moreira Scriver
RG: 016856972001-5
CPF: 032.978.163-41
TITULAR

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº DA MEDIÇÃO
LOCAL
PERÍODO
DATA

PRIMEIRA
PALMEIRAS
09/02 A 26/06
26/06/2026

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE		FINANCEIRO		SALDO		
								AC. ANT	AC ATUAL	AC TOTAL	AC. ANT	AC ATUAL	AC TOTAL	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA - REV 02 - 09/2021	ORSE	UN	1,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00		1,00	R\$ 1,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	-	0,00%
1.2	COMP SSAD 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	COMPOSIÇÕES	MES	6,00	R\$ 5.604,12	R\$ 33.624,72		3,00	R\$ 3,00	R\$ 16.812,36	R\$ 16.812,36	R\$ 16.812,36	50,00%
1.3	98524	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	SINAPI	M2	375,00	R\$ 4,56	R\$ 1.708,51		375,00	R\$ 375,00	R\$ 1.708,51	R\$ 1.708,51	R\$ -	0,00%
2	CAPTAÇÃO													
2.1	CANTEIRO DE POÇOS													
2.1.1	COMP SSAD 02	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	COMPOSIÇÕES	KM	55,00	R\$ 17,11	R\$ 940,80		55,00	R\$ 55,00	R\$ 940,80	R\$ 940,80	R\$ -	0,00%
2.1.2	240201	ABRIGO PROVISÓRIO E NIVELAMENTO DA PERIFERIZ	CAEMA	UN	1,00	R\$ 308,83	R\$ 308,83		1,00	R\$ 1,00	R\$ 308,83	R\$ 308,83	R\$ -	0,00%
2.1.3	240204	ESCOVAÇÃO DOS TANQUES E CANALETAS DE LAMA	CAEMA	M3	9,24	R\$ 97,89	R\$ 905,39		9,24	R\$ 9,24	R\$ 905,39	R\$ 905,39	R\$ -	0,00%
2.1.4	S05088	BARRAÇÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	ORSE	M2	25,00	R\$ 231,50	R\$ 5.787,58		25,00	R\$ 25,00	R\$ 5.787,58	R\$ 5.787,58	R\$ -	0,00%
2.2	PERFURAÇÃO													
2.2.1	240312	PERF. 8" EM SEDIMENTO (DE 0 A 50 M)	CAEMA	M	50,00	R\$ 76,35	R\$ 3.817,28			R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
2.2.2	240324	PERF. 8" EM SEDIMENTO (DE 50 A 100 M)	CAEMA	M	50,00	R\$ 80,16	R\$ 4.007,77		50,00	R\$ 50,00	R\$ 3.817,28	R\$ 3.817,28	R\$ -	0,00%
2.2.3	240335	PERF. 8" EM SEDIMENTO (DE 100 A 150 M)	CAEMA	M	20,00	R\$ 88,17	R\$ 1.763,31		20,00	R\$ 20,00	R\$ 4.007,77	R\$ 4.007,77	R\$ -	0,00%
2.2.4	240309	REABERTURA DA PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO NO DIÂMETRO DE 14" (DE 0 A 50 M)	CAEMA	M	50,00	R\$ 131,85	R\$ 6.592,25		50,00	R\$ 50,00	R\$ 1.763,31	R\$ 1.763,31	R\$ -	0,00%
2.2.5	240321	REABERTURA DA PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO NO DIÂMETRO DE 14" (DE 50 A 100M)	CAEMA	M	50,00	R\$ 138,45	R\$ 6.922,32		50,00	R\$ 50,00	R\$ 6.592,25	R\$ 6.592,25	R\$ -	0,00%
2.2.6	240332	REABERTURA DA PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO NO DIÂMETRO DE 14" (DE 100 A 150M)	CAEMA	M	20,00	R\$ 152,31	R\$ 3.046,21		20,00	R\$ 20,00	R\$ 6.922,32	R\$ 6.922,32	R\$ -	0,00%
2.3	COMPLEMENTAÇÃO													
2.3.1	240410	INSTALAÇÃO REVESTIMENTO EM PVC	CAEMA	M	120,00	R\$ 10,81	R\$ 1.297,74			R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
2.3.2	240416	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÉ-FILTRO	CAEMA	M3	10,00	R\$ 312,23	R\$ 3.122,25		120,00	R\$ 120,00	R\$ 1.297,74	R\$ 1.297,74	R\$ -	0,00%
2.3.3	240422	PROTEÇÃO SANITÁRIA	CAEMA	M3	0,81	R\$ 301,38	R\$ 244,12		10,00	R\$ 10,00	R\$ 3.122,25	R\$ 3.122,25	R\$ -	0,00%
2.3.4	240425	LIMPEZA COM COMPRESSOR	CAEMA	H	24,00	R\$ 132,37	R\$ 3.176,88		0,81	R\$ 0,81	R\$ 244,12	R\$ 244,12	R\$ -	0,00%
2.3.5	240434	DESENVOLVIMENTO COM BOMBA	CAEMA	H	24,00	R\$ 100,19	R\$ 2.404,56		24,00	R\$ 24,00	R\$ 3.176,88	R\$ 3.176,88	R\$ -	0,00%
2.3.6	240437	TESTE DE PRODUÇÃO COM BOMBA	CAEMA	H	12,00	R\$ 100,19	R\$ 1.202,28		24,00	R\$ 24,00	R\$ 2.404,56	R\$ 2.404,56	R\$ -	0,00%
2.3.7	240446	DESINFECÇÃO	CAEMA	M3	8,14	R\$ 46,51	R\$ 378,60		12,00	R\$ 12,00	R\$ 1.202,28	R\$ 1.202,28	R\$ -	0,00%
2.3.8	240452	CENTRALIZADORES EM AÇO 6" X 14"	CAEMA	UN	10,00	R\$ 43,13	R\$ 431,30		8,14	R\$ 8,14	R\$ 378,60	R\$ 378,60	R\$ -	0,00%
2.4	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA DO POÇO TUBULAR													
2.4.1	240470	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DAS EXPENSAS DO EMPREITEIRO (A MESMA SERÁ ACEITA SE ESTIVER DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM A MATRÍCULA E NOME DO SERVIDOR DA CAEMA QUE EFETUOU A COLETA)	CAEMA	UN	1,00	R\$ 571,92	R\$ 571,92			R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
2.5	TUBO DE REVESTIMENTO EM PVC													
2.5.1	00009854	TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M	SINAPI	M	84,00	R\$ 110,52	R\$ 9.283,68			R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!

9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										#DIV/0!		
9.1	101197	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T", PONTA INCLINADA 10X15 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M, GRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 05/2020	SINAPI	M	60,00	R\$ 119,70	R\$ 7.181,73	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.181,73	100,00%
9.2	112459	PORTÃO EM BARRAS DE FERRO VERT. QUADRO 78"X114" COM 6 BARRAS HOR. 1/2"X3/16" (2 A 2) E QUADRO 78"X114" INCLUSIVE 3 DOBRADIÇAS, FERROLHO PORTA-CADEADO, BATEDOR E CHUMBADORES	ORSE	M2	6,00	R\$ 424,78	R\$ 2.548,68	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.548,68	100,00%
9.3	00010848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, "40" CM X "60" CM	SINAPI	UN	1,00	R\$ 723,60	R\$ 723,60	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 723,60	100,00%
9.4	S02450	LIMPEZA GERAL	ORSE	M2	100,00	R\$ 2,27	R\$ 226,53	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 226,53	100,00%
							VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 287.469,30	R\$ 83.309,75	R\$ 83.309,75	R\$ 204.159,55		
							VALOR BDI TOTAL:	R\$ 85.953,32	R\$ 24.909,62	R\$ 24.909,62	R\$ 61.043,70		
							VALOR TOTAL:	R\$ 373.422,62	R\$ 108.219,37	R\$ 108.219,37	R\$ 265.203,24		

São Luís, 26 de JUNHO de 2026



Pedro Sereno Moreira Scriverer
Eng. Civil e Socio ADM
(98) 9 98868-3149

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

R\$ 108.219,37

A SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA, inscrita no CNPJ n ° 69.391.274/0001-55, sediada na Rua Renato Viana, 110, Ivar Saldanha, em São Luís – MA, CEP 65.036-000, por intermédio do seu representante legal Sr. PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER, portador do CPF 032.978.163-41, vem requerer, da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, MARANHÃO**, o valor de **R\$ 108.219,37 (CENTO E OITO MIL, DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)**, referente à **1ª medição** dos serviços dos serviços de construção de um sistema simplificado de abastecimento no povoado Palmeiras no Município de Chapadinha/MA, objeto do Contrato 197/2025.

Atenciosamente,

São Luís – MA, 06 de Julho de 2026



Pedro Sereno M. Scriviner
Engenheiro Civil
CREA 113326271
Responsável Técnico

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
PEDRO SCRIVINER
CPF: 032.978.163-41

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA												
EMPRESA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA CNPJ 09.391.274/0001-55												
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ZONA RURAL												
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 02/02/2028 a 29/06/2028												
DATA DA MEDIÇÃO: 29/06/2028												
CONTRATO ADMINISTRATIVO: Nº 197/2025 PROC. ADM. Nº 5024/2024 DATA: 02/06/2025												
MEDIÇÃO: 1ª MEDIÇÃO												
LOCALIDADE: POVOADO PALMEIRAS												
												
P.L.S - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DE ÁGUA - ZONA RURAL												
ITEM	SERVIÇO	UNID	CONTRATADO		ACUM. ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO		VALOR FINAL	
			QUANT.	P. UNIT C/ BDI	TOTAL	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	ACUM.
												ATUAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA - REV 02 - 08/2021	UN	1,00		750,00	0,00	0,00%		1,00	100,00%		750,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,00		5.804,12	0,00	0,00%		3,00	50,00%		16.812,36
1.3	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	M2	375,00		4,56	0,00	0,00%		375,00	100,00%		1.708,51
	SUB TOTAL				38.083,33							19.270,87
	TOTAL DO ITEM				38.083,33							19.270,87
2.0 CAPTAÇÃO												
2.1 CANTEIRO DE POÇOS												
2.1	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	KM	55,00		940,80	0,00	0,00%		55,00	100,00%		940,80
2.2	ABRIGO PROVISÓRIO E NIVELAMENTO DA PERFURATRIZ	UN	1,00		308,83	0,00	0,00%		1,00	100,00%		308,83
2.3	ESCAVAÇÃO DOS TANQUES E CANALETAS DE LAMA	M3	9,24		905,39	0,00	0,00%		9,24	100,00%		905,39
2.4	BARRAÇÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	M2	25,00		231,50	0,00	0,00%		25,00	100,00%		5.787,58
	SUB TOTAL				7.842,60							7.842,60
	TOTAL DO ITEM				7.842,60							7.842,60
2.2 PERFURAÇÃO												
2.2.1	PERF. 8" EM SEDIMENTO (DE 0 A 50 M)	M	50,00		3.817,28	0,00	0,00%		50,00	100,00%		3.817,28
2.2.2	PERF. 8" EM SEDIMENTO (DE 50 A 100 M)	M	50,00		4.007,77	0,00	0,00%		50,00	100,00%		4.007,77
2.2.3	PERF. 8" EM SEDIMENTO (DE 100 A 150 M)	M	20,00		1.763,31	0,00	0,00%		20,00	100,00%		1.763,31
2.2.4	REABERTURA DA PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO NO DIÂMETRO DE 14" (DE 0 A 50 M)	M	50,00		6.592,25	0,00	0,00%		50,00	100,00%		6.592,25
2.2.5	REABERTURA DA PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO NO DIÂMETRO DE 14" (DE 50 A 100M)	M	50,00		6.922,32	0,00	0,00%		50,00	100,00%		6.922,32
2.2.6	REABERTURA DA PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO NO DIÂMETRO DE 14" (DE 100 A 150M)	M	20,00		3.046,21	0,00	0,00%		20,00	100,00%		3.046,21
	SUB TOTAL				28.148,13							28.148,13
	TOTAL DO ITEM				28.148,13							28.148,13
2.3 COMPLEMENTAÇÃO												
2.3.1	INSTALAÇÃO REVESTIMENTO EM PVC	M	120,00		1.297,74	0,00	0,00%		120,00	100,00%		1.297,74
2.3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PRÉ-FILTRO	M3	10,00		3.122,25	0,00	0,00%		10,00	100,00%		3.122,25
2.3.3	PROTEÇÃO SANITÁRIA	M3	0,81		244,12	0,00	0,00%		0,81	100,00%		244,12
2.3.4	LIMPEZA COM COMPRESSOR	H	24,00		3.176,88	0,00	0,00%		24,00	100,00%		3.176,88
2.3.5	DESENVOLVIMENTO COM BOMBA	H	24,00		2.404,56	0,00	0,00%		24,00	100,00%		2.404,56
2.3.6	TESTE DE PRODUÇÃO COM BOMBA	H	12,00		1.202,28	0,00	0,00%		12,00	100,00%		1.202,28
2.3.7	DESINFECÇÃO	M3	8,14		378,60	0,00	0,00%		8,14	100,00%		378,60
2.3.8	CENTRALIZADORES EM AÇO 6" X 14"	UN	10,00		431,30	0,00	0,00%		10,00	100,00%		431,30
	SUB TOTAL				12.257,73							12.257,73
	TOTAL DO ITEM				12.257,73							12.257,73
2.4 ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA DO POÇO TUBULAR												
2.4.1	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA ÀS EXPENSAS DO EMPREITEIRO (A MESMA SERÁ ACEITA SE ESTIVER DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM A MATRÍCULA E NOME DO SERVIDOR DA CADEIA QUE EFETUOU A COLETA)	UM	1,00		571,92	0,00	0,00%		1,00	100,00%		571,92
	SUB TOTAL				571,92							571,92
	TOTAL DO ITEM				571,92							571,92
2.5 TUBO DE REVESTIMENTO EM PVC												
2.5.1	TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2,2 M	M	84,00		110,52	0,00	0,00%		84,00	100,00%		9.283,68
	SUB TOTAL				9.283,68							9.283,68
	TOTAL DO ITEM				9.283,68							9.283,68
2.6 FILTRO EM PVC												
2.6.1	REVESTIMENTO FILTRO PVC - GEOMECÂNICO STAND DN 154MM	M	36,00		198,69	0,00	0,00%		36,00	100,00%		7.152,84
	SUB TOTAL				7.152,84							7.152,84
	TOTAL DO ITEM				7.152,84							7.152,84
2.7 CAP EM PVC ATIVADO												
2.7.1	TAMPA DE FUNDO - CAP FÊMEA GEOMECÂNICO STAND EM 154MM	UND	1,00		340,49	0,00	0,00%		1,00	100,00%		340,49
2.7.2	TAMPA DE POÇO CAP MACHO STAND EM 154MM	UND	1,00		340,49	0,00	0,00%		1,00	100,00%		340,49
	SUB TOTAL				680,98							680,98
	TOTAL DO ITEM				680,98							680,98
3.0 ADUTORA												
3.1	LOCAÇÃO DE ADUTORA	M	15,00		20,76	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF 02/2021	M3	1,80		137,95	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00
3.3	REATERRO APLICADO	M3	1,75		57,75	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00

Handwritten signature/initials.

[illegible]

३

9.1	CERCA COM NOZUROS DE CONCRETO, SEÇÃO "T", PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 05/2020	M	60,00	119,70	7.181,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
9.2	PORTÃO EM BARRAS DE FERRO VERT. QUADR. 1/2" C/12CM, 6 BARRAS HOR. 1/2"X3/16" (2 A 2) E QUADRO 7/8"X1/4", INCLUSIVE 3 DOBRADIÇAS, FERROLHO PORTA-CADEADO, BATEDOR E CHUMBADES	M2	6,00	424,78	2.548,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
9.3	PLACA DE INAUSCURAÇÃO METÁLICA, 40" CM X 90" CM	UN	1,00	723,60	723,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
9.4	LIMPEZA GERAL	M2	100,00	2,27	226,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL					10.680,55										0,00
TOTAL DO ITEM					10.680,55										0,00
VALOR TOTAL					287.489,30									83.308,75	83.308,75
VALOR DO BDI (20,80%)					59.853,32									24.809,82	24.809,82
VALOR TOTAL COM BDI					373.422,82							28,98	28,98	108.219,37	108.219,37
VALOR TOTAL DO CONTRATO : R\$ 373.422,82 (TREZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)															
VALOR DA 1ª MEDIÇÃO: R\$ 108.219,37 (CENTO E OITO MIL DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) CORRESPONDENTE A 28,98% DE EXECUÇÃO															
SALDO DA PROPOSTA (R\$): 285.203,26															


Edvaldo Paz Nunes
CREANAC 110.313.774-3
engenheiro civil

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

CONTRATO: 197/2025

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADO PALMEIRAS

MEDIÇÃO: 1ª (PRIMEIRA MEDIÇÃO)



PERFURAÇÃO DE POÇO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

CONTRATO: 197/2025

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADO PALMEIRAS

MEDIÇÃO: 1ª (PRIMEIRA MEDIÇÃO)



PERFURAÇÃO DE POÇO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

CONTRATO: 197/2025

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADO PALMEIRAS

MEDIÇÃO: 1ª (PRIMEIRA MEDIÇÃO)



PERFURAÇÃO DE POÇO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

CONTRATO: 197/2025

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADO PALMEIRAS

MEDIÇÃO: 1ª (PRIMEIRA MEDIÇÃO)



PERFURAÇÃO DE POÇO

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
CNPJ: 69.391.274/0001-55

RELATÓRIO TÉCNICO CONSTRUTIVO DE POÇO TUBULAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

BAIRRO: POVOADO PALMEIRAS

MUNICIPIO: CHAPADINHA ESTADO: MA

P-01 – POVOADO PALMEIRAS

Responsável Técnico:

Carlos Borromeu de Passos Vale

GEÓLOGO CREA 110219873-0.

ABRIL DE 2026

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
CNPJ: 69.391.274/0001-55

EXECUTADOR: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSTRUTORES LTDA

CNPJ: 69.391.274/0001-55

MUNICÍPIO: CHAPADINHA

ESTADO: MA

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

CNPJ: 69.391.274/0001-55

1-LOCALIZAÇÃO

Localização: Povoado Palmeiras, na região da Mangabeira, próximo ao

Povoado Atoleiro, no local definido pelas coordenadas abaixo:

30°50'40 "S 43°23'15 "W

2-ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS

Profundidade 164,00m

Sistema de perfuração: Rotativo

Diâmetro de perfuração: 12 polegadas

Diâmetro de revestimento: 6 polegadas

Posição dos Filtros: 112 a 116,00m / 120 a 124m / 128 a 132m / 136 a 144m / 148 a 160m.


Comentário conclusivos: Vazão 31,68 m³/h

Obs: O poço foi revestido com 33 canos e 8 filtros.

Dos 8 Filtros, captam água no intervalo mais arenoso de 125 a 160m

CARLOS
BORROMEU DE
PASSOS
VALE:08687340125

Assinado de forma
digital por CARLOS
BORROMEU DE PASSOS
VALE:08687340125
Dados: 2026.05.04
08:21:00 -03'00'

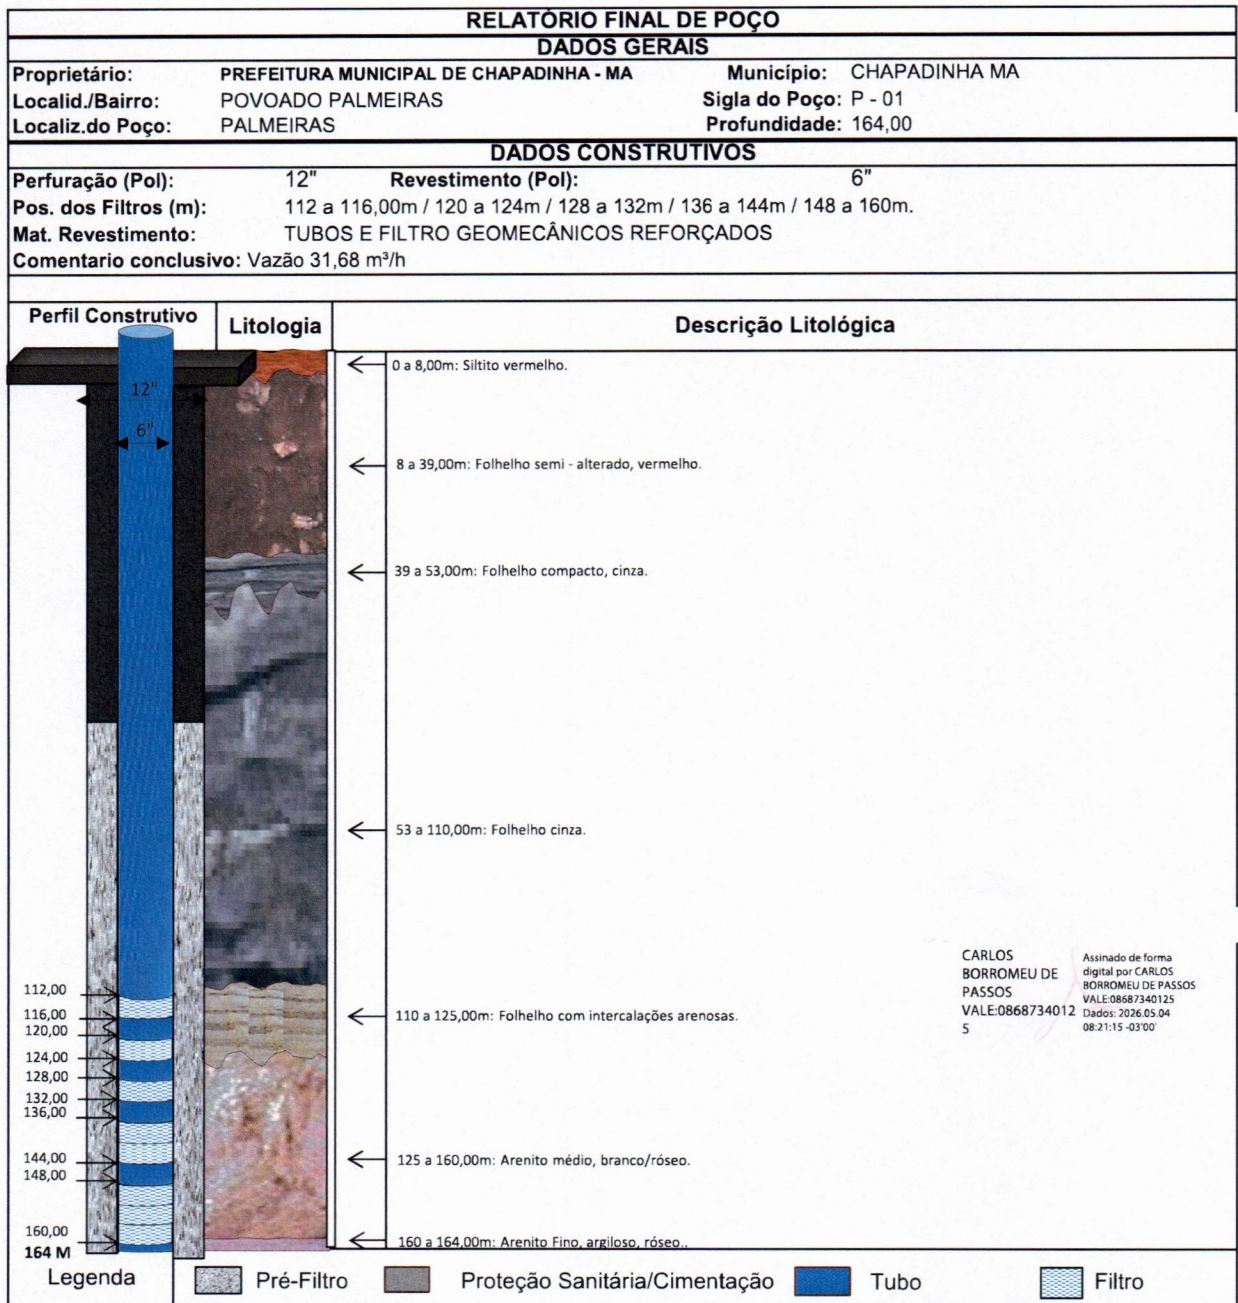



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000578

Data e Hora da Emissão

06/07/2026 10:36:27

Competência da NFS-e

07/2026

Código de Verificação

EFF1.4F9B.E277.991B.5C84.D7C6.6488.886A

CERTIFICADO
1020260092198575

Chave de Acesso da NFS-e

2111300126939127400015500000000057826076724122722

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome / Razão Social: **SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**CPF / CNPJ: **69.391.274/0001-55**Inscrição Municipal: **33515006**Endereço: **R RENATO VIANA, 110, LETRA A - BAIRRO VILA IVAR SALDANHA - CEP: 65036000**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **eletrob@bol.com.br**Telefone: **(98) 88683149****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA**CPF/CNPJ: **11.844.664/0001-53**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R JUSCELINO KUBSTCHEK, SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65500000**Município: **CHAPADINHA**UF: **MA**Email: **dhiankarlo.araujo@gmail.com**Telefone: **(98) 89114087****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADO PALMEIRAS, NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA. CONTRATO 197/2025

ATESTO QUE:

OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS



OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM

06 / 07 / 2026

Advaldo Paz Nunes

CREANAC 110.313.774-3

Engenheiro Civil

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1	108.219,37	108.219,37

PIS (0,00%): R\$ 0,00	COFINS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,2000%): R\$ 1.298,63
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	IBS MUNICIPAL (0,00%): R\$ 0,00	IBS ESTADUAL (0,05%): R\$ 51,40	CBS (0,45%): R\$ 462,64

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 108.219,37

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 108.219,37	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 5.410,97
--	--	--	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕESLocal de Incidência Imposto: Local da Prestação
Local de Prestação do Serviço: **CHAPADINHA / MA**Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO**Recolhimento: **RETIDO**

Atividade:

422270100 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO

NBS:

101034100 - Serviços de perfuração de poços de água

Serviço:

070202 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,

Mês de



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
CNPJ: 69.391.274/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:25:05 do dia 02/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/11/2026.

Código de controle da certidão: **F4D1.A545.EAF1.8389**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00013917872026

Validade: 08/10/2026

Certificamos que até a presente data não consta débito fiscal relativo a pessoa jurídica, descrita abaixo, reserva-se o direito de a fazenda municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista nos artigos 80 e 146, da lei 6.289, de 28/12/2017 do código tributário municipal.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 69.391.274/0001-55	Inscrição Municipal: 33515006
Razão Social: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA RENATO VIANA	
Número: 110	Complemento: LETRA A
Bairro: VILA IVAR SALDANHA	
Município: SÃO LUIS - MA	CEP: 65036000

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **10 de junho de 2026 as 11:15**, sob o código de autenticidade nº **F07F2D966EDAC28B3FE4258466542C04**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 69.391.274/0001-55
Razão social: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
Endereço: R RENATO VIANA 110 LETRA A/ VILA IVAR SALDANHA / SAO LUIS / MA / 65036-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/06/2026 a 13/07/2026

Certificação Número: 2026061402250483711407

Informação obtida em 06/07/2026 10:44:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 038929/26

Data da

17/04/2026 11:32:04

Inscrição Estadual: 129242284

CPF/CNPJ: 69391274000155

Razão Social: SF ENGENHARIA-EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Endereço: RUA RENATO VIANA, 110 LETRA A; CEP: 65036000 - VILA IVAR SALDANHA

Telefone: (98)88683149

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 16/07/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 13/05/2026 16:46:24



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 082193/26

Data da

17/04/2026 11:31:28

Inscrição Estadual: 129242284

CPF/CNPJ: 69391274000155

Razão Social: SF ENGENHARIA-EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Endereço: RUA RENATO VIANA, 110 LETRA A; CEP: 65036000 - VILA IVAR SALDANHA

Telefone: (98)88683149

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 16/07/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.
