

OFICIO Nº 313/2026-GAB. SINURB

Chapadina MA, 15 de julho de 2026.

À Senhora
Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação.

Assunto: Processo para pagamento da 3ª medição do 4º termo aditivo dos serviços de construção de quadras poliesportivas no município de Chapadina-MA, executados pela Empresa META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.

Senhora Secretária,

Com os cumprimentos iniciais, aproveitamos do expediente, para encaminhar em anexo processo para análise e posterior deliberação do processo para pagamento da **3ª medição** do 4º termo aditivo de serviços executados pela empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA**, sob CNPJ nº 39.590.842/0001-86, referente a **serviços de construção de quadras poliesportivas no município de Chapadina** (LOTE 1. U.E. Nossa Senhora Aparecida, em Chapadina/LOTE 2. Jardim de Infância Antônio Lopes de Lima, no Bairro Liberdade/LOTE 3. U.I. Raimundo Teixeira Lisboa, Pov. Rodeio) conforme:

Contrato nº 268/2024,

Proc. Adm. nº 2495/2025

Concorrência nº 024/2024,

Referência: LOTE 3.: U.I. Raimundo Teixeira Lisboa, Povoado Rodeio,

NF nº 74,

Valor R\$ 565.663,71

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos ao passo que renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

RECEBIDO
EM 15/07/26
HORARIO: 16:45
Leandra Giovanna
RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO

Ofício nº 039/2026

Chapadinha – MA, 10 de julho de 2025

Excelentíssimo Senhor,

Sr. Raimundo Peres da Silva Filho

Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Chapadinha - MA

Solicitação de Medição

A empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na Rua 16, QD 37, nº 07, Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **39.590.842/0001-86**, através do seu sócio administrador kerlly Kaio de Lima da Conceição, CPF 053.823.563-27, RG 04313313201-1, detentora do contrato de Nº 268/2024, CONCORRÊNCIA-024/2024, processo administrativo 3228/2024, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, solicitar a 3ª medição do lote III, do referido contrato.

KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
6327

Assinado de forma digital por
KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
Dados: 2026.07.10 15:56:12
-03'00'

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
(SÓCIO ADMINISTRADOR)

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EMPRESA: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ.: 39.590.824/0001-86

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM ARQUIBANCADA E VESTIÁRIOS NA U.I. RAIMUNDO TEIXEIRA LISBOA NO POVOADO RODEIO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA - LOTE III

LICITAÇÃO: Nº 024/2024

Nº DO CONTRATO: Nº268/2024

MEDICÃO: 3ª Medição R\$ 565.663,71

PERÍODO DE REFERÊNCIA A: 01/11/2025 a 13/07/2026

DATA: 13/07/2026



ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATADO			ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL	
		FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANT.	%	QUANT.	EXCEDENTE/ DIVERGENTE	QUANT.	%	EXCEDENTE/ DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					46.579,96								11.985,49	37.816,50
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					25.407,58								11.985,49	20.394,12
1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	90778	H	66,00	98,99	6.533,34	21,50	33%	31,50	48%	53,00	80%		R\$ 3.118,19	R\$ 5.246,47
1.1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	90778	H	704,00	26,81	18.874,24	235,00	33%	330,00	47%	565,00	80%		R\$ 8.847,30	R\$ 15.147,65
1.2	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA - REV 02 - 09/2021	S11387	UN	6,00	750,00	4.500,00	1,00	17%	0,00	0%	1,00	17%		R\$ -	R\$ 750,00
1.3	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS AF 01/2024, PE	104894	M2	9,00	1.206,93	10.862,37	9,00	100%	0,00	0%	9,00	100%		R\$ -	R\$ 10.862,37
1.4	LOCAÇÃO DA OBRA (EXECUÇÃO DE GABARITO)	C1630	M2	768,63	5,10	3.920,01	768,63	100%	0,00	0%	768,63	100%		R\$ -	R\$ 3.920,01
1.5	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	S09937	M2	1.000,00	1,89	1.890,00	1.000,00	100%	0,00	0%	1.000,00	100%		R\$ -	R\$ 1.890,00
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES					22.198,48								0,00	22.198,48
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF 01/2024	96527	M3	107,88	95,16	10.265,86	107,88	100%	0,00	0%	107,88	100%		R\$ -	R\$ 10.265,86
2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	101617	M2	53,03	2,86	151,67	53,03	100%	0,00	0%	53,03	100%		R\$ -	R\$ 151,67
2.3	REATERRO MECANIZADO DE VALAS COM RETROESCAVADEIRA	93381	M3	57,55	11,14	641,11	57,55	100%	0,00	0%	57,55	100%		R\$ -	R\$ 641,11
2.4	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	C0328	M3	115,20	96,70	11.139,84	115,20	100%	0,00	0%	115,20	100%		R\$ -	R\$ 11.139,84
3	FUNDAÇÕES					82.742,42								0,00	82.742,42
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS					59.553,55								0,00	59.553,55
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESURA SCM - FUNDO DE VALA	96619	M2	68,60	36,58	2.509,39	68,60	100%	0,00	0%	68,60	100%		R\$ -	R\$ 2.509,39
3.1.2	FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO	96535	M2	67,25	127,21	8.554,87	67,25	100%	0,00	0%	67,25	100%		R\$ -	R\$ 8.554,87
3.1.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	92919	KG	986,55	11,85	11.690,62	986,55	100%	0,00	0%	986,55	100%		R\$ -	R\$ 11.690,62
3.1.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	92915	KG	55,00	16,00	880,00	55,00	100%	0,00	0%	55,00	100%		R\$ -	R\$ 880,00
3.1.5	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPa; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	96558	M3	44,15	813,56	35.918,67	44,15	100%	0,00	0%	44,15	100%		R\$ -	R\$ 35.918,67
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES					23.188,87								0,00	23.188,87
3.2.1	LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESURA 7CM, COM IMPERMEABILIZANTE ENTRE BALDRAMES	94988	M3	13,20	373,37	4.928,48	13,20	100%	0,00	0%	13,20	100%		R\$ -	R\$ 4.928,48
3.2.2	FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO	96536	M2	88,40	68,92	6.092,53	88,40	100%	0,00	0%	88,40	100%		R\$ -	R\$ 6.092,53
3.2.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	92917	KG	307,20	13,53	4.156,42	307,20	100%	0,00	0%	307,20	100%		R\$ -	R\$ 4.156,42
3.2.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	92919	KG	144,45	11,85	1.711,73	144,45	100%	0,00	0%	144,45	100%		R\$ -	R\$ 1.711,73
3.2.5	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	92915	KG	132,10	16,00	2.113,60	132,10	100%	0,00	0%	132,10	100%		R\$ -	R\$ 2.113,60
3.2.6	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPa; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	96557	M3	5,36	780,99	4.186,11	5,36	100%	0,00	0%	5,36	100%		R\$ -	R\$ 4.186,11
4	SUPERESTRUTURA					378.099,80								298.961,05	378.099,80
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES					25.438,45								0,00	25.438,45
4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO	92443	M2	121,10	47,33	5.731,66	121,10	100%	0,00	0%	121,10	100%		R\$ -	R\$ 5.731,66
4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 08/2022	92762	KG	160,50	10,98	1.762,29	160,50	100%	0,00	0%	160,50	100%		R\$ -	R\$ 1.762,29

Lucas de B. Monteiros
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA: 111983915-7

6.3.1	PORTA DE ABRIR - PA4 - 70X185 CM - VENEZIANA- CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	91341	M2	6,93	679,98					0,00	0%		0,00	0%					R\$	-	R\$	-
6.4	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA									1.717,43										0,00		0,00
6.4.1	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-02 - 120X60 CM, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	94569	M2	2,30	746,71					1.717,43	0,00	0%		0,00	0%				R\$	-	R\$	-
6.5	VIDROS									1.540,37										0,00		0,00
6.5.1	ESPELHO CRISTAL E=4MM SEM MOLDURA	C4835	M2	3,05	505,04					1.540,37	0,00	0%		0,00	0%				R\$	-	R\$	-
7	SISTEMAS DE COBERTURA									72.829,05										72.829,05		72.829,05
7.1	TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL - ESPESSURA 0,5MM	94213	M2	933,00	72,97					68.081,01	0,00	0%		933,00	100%				R\$	68.081,01	R\$	68.081,01
7.2	CALHA EM CHAPA METÁLICA DOBRADA, DESENVOLVIMENTO 40CM E=0,05MM	94228	M	60,50	78,48					4.748,04	0,00	0%		60,50	100%				R\$	4.748,04	R\$	4.748,04
8	IMPERMEABILIZAÇÃO									4.363,75										0,00		4.363,75
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	98557	M2	75,20	42,17					3.171,18	75,20	100%		0,00	0%				R\$	-	R\$	3.171,18
8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	98557	M2	28,28	42,17					1.192,57	28,28	100%		0,00	0%				R\$	-	R\$	1.192,57
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO									53.060,64										11.595,44		53.060,64
9.1	CHAPISCO DE ADERÊNCIA EM PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, VIGAS, PLATIBANDA E CALHAS	87879	M2	1.050,00	4,16					4.388,00	1.050,00	100%		0,00	0%				R\$	-	R\$	4.388,00
9.2	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS TRAÇO 1:2:9 - PREPARO MECANICO - ESPESSURA 2,0 CM	87529	M2	1.050,00	35,68					37.464,00	1.040,00	99%		10,00	1%				R\$	356,80	R\$	37.464,00
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV- CERÂMICA 32 X 45CM - INCL. REJUNTE	87273	M2	103,52	74,05					7.665,66	0,00	0%		103,52	100%				R\$	7.665,66	R\$	7.665,66
9.4	PASTILHA CERÂMICA 10X10CM - VERMELHA	C4411	M2	12,02	151,81					1.824,76	0,00	0%		12,02	100%				R\$	1.824,76	R\$	1.824,76
9.5	PASTILHA CERÂMICA 10X10CM - AZUL	C4411	M2	11,45	151,81					1.738,22	0,00	0%		11,45	100%				R\$	1.738,22	R\$	1.738,22
10	SISTEMAS DE PISOS									38.369,47										11.246,22		11.246,22
10.1	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 4 CM - ÁREAS MOLHADAS	87630	M2	50,00	38,36					1.918,00	0,00	0%		50,00	100%				R\$	1.918,00	R\$	1.918,00
10.2	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF. 08/2021	102494	M2	481,25	56,36					27.123,25	0,00	0%		0,00	0%				R\$	-	R\$	-
10.3	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI V - 45 X 45 CM - INCL. REJUNTE	104606	M2	50,00	74,77					3.738,50	0,00	0%		50,00	100%				R\$	3.738,50	R\$	3.738,50
10.4	RODAPÊ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS DE DIMENSÕES 45X45 CM	88849	M	9,60	9,36					89,86	0,00	0%		9,60	100%				R\$	89,86	R\$	89,86
10.5	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2 CM	98689	M	4,60	118,43					544,78	0,00	0%		4,60	100%				R\$	544,78	R\$	544,78
10.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022	94980	M3	6,60	750,77					4.955,08	0,00	0%		6,60	100%				R\$	4.955,08	R\$	4.955,08
11	PINTURAS E ACABAMENTOS									30.210,00										0,00		0,00
11.1	EMASSAMENTO DE TETO COM MASSA CORRIDA PVA, 2 DEMÃOS	88497	M2	50,00	16,07					803,50	0,00	0%		0,00	0%				R\$	-	R\$	-
11.2	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM MASSA ACRILICA, 2 DEMÃOS	88497	M2	950,00	16,07					15.266,50	0,00	0%		0,00	0%				R\$	-	R\$	-
11.3	PINTURA EM ACRILICO SOBRE TETO, 2 DEMÃOS	88489	M2	50,00	14,14					707,00	0,00	0%		0,00	0%				R\$	-	R\$	-
11.4	PINTURA EM LÁTEX ACRILICO SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - BRANCO GEL, 2 DEMÃOS	88489	M2	950,00	14,14					13.433,00	0,00	0%		0,00	0%				R\$	-	R\$	-
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA									4.911,34										4.911,34		4.911,34
12.1	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM	89446	M	71,18	4,93					350,92	0,00	0%		71,18	100%				R\$	350,92	R\$	350,92
12.2	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM	89448	M	0,35	15,03					5,26	0,00	0%		0,35	100%				R\$	5,26	R\$	5,26
12.3	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM	89449	M	15,27	16,63					253,94	0,00	0%		15,27	100%				R\$	253,94	R\$	253,94
12.4	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLS-ROSCA PARA REGISTRO - 25MM - 3/4"	94656	UN	31,00	5,62					174,22	0,00	0%		31,00	100%				R\$	174,22	R\$	174,22
12.5	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLS-ROSCA PARA REGISTRO - 50MM - 1 1/2"	89598	UN	14,00	9,08					127,12	0,00	0%		14,00	100%				R\$	127,12	R\$	127,12
12.6	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLS-ROSCA PARA REGISTRO - 50MM - 1 1/4"	89595	UN	7,00	12,66					88,62	0,00	0%		7,00	100%				R\$	88,62	R\$	88,62
12.7	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 60MM-50MM	89605	UN	3,00	18,06					54,18	0,00	0%		3,00	100%				R\$	54,18	R\$	54,18
12.8	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50MM-25MM	89605	UN	3,00	18,06					54,18	0,00	0%		3,00	100%				R\$	54,18	R\$	54,18
12.9	JOELHO 45 SOLDÁVEL - 25MM	89485	UN	2,00	5,36					10,72	0,00	0%		2,00	100%				R\$	10,72	R\$	10,72
12.10	JOELHO 45 SOLDÁVEL - 75MM	89515	UN	1,00	73,44					73,44	0,00	0%		1,00	100%				R\$	73,44	R\$	73,44
12.11	JOELHO 90 SOLDÁVEL - 25MM	89362	UN	46,00	8,27					380,42	0,00	0%		46,00	100%				R\$	380,42	R\$	380,42
12.12	JOELHO 90 SOLDÁVEL - 50MM	89501	UN	7,00	12,45					87,15	0,00	0%		7,00	100%				R\$	87,15	R\$	87,15
12.13	LUVA SOLDÁVEL 25MM	89605	UN	13,00	18,06					234,78	0,00	0%		13,00	100%				R\$	234,78	R\$	234,78
12.14	LUVA SOLDÁVEL 50MM	89605	UN	4,00	18,06					72,24	0,00	0%		4,00	100%				R\$	72,24	R\$	72,24
12.15	JOELHO 90 SOLDÁVEL COM ROSCA 25 X 3/4" MM	90373	UN	1,00	11,55					11,55	0,00	0%		1,00	100%				R\$	11,55	R\$	11,55

12.16	JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO - 25MM - 3/4"	90373	UN	10,00	11,55	115,50	0,00	0%		10,00	100%		115,50	R\$	115,50
12.17	JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO - 25MM - 1/2"	89645	UN	7,00	27,07	189,49	0,00	0%		7,00	100%		189,49	R\$	189,49
12.18	TÊ 90 SOLDÁVEL 25MM	89395	UN	6,00	11,39	68,34	0,00	0%		6,00	100%		68,34	R\$	68,34
12.19	TÊ SOLDÁVEL 50MM	89625	UN	2,00	19,78	39,56	0,00	0%		2,00	100%		39,56	R\$	39,56
12.20	TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50MM - 25MM	89627	UN	3,00	17,60	52,80	0,00	0%		3,00	100%		52,80	R\$	52,80
12.21	ENGATE FLEXÁVEL PLÁSTICO 1/2" - 30CM	89884	UN	10,00	9,53	95,30	0,00	0%		10,00	100%		95,30	R\$	95,30
12.22	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO BOLSA CENTRAL - 25MM - 3/4"	90374	UN	3,00	19,76	59,28	0,00	0%		3,00	100%		59,28	R\$	59,28
12.23	REGISTRO DE ESFERA 3/4"	90371	UN	1,00	31,42	31,42	0,00	0%		1,00	100%		31,42	R\$	31,42
12.24	REGISTRO BRUTO DE GAVETA 2 1/2"	94499	UN	1,00	230,90	230,90	0,00	0%		1,00	100%		230,90	R\$	230,90
12.25	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1 1/2"	94784	UN	2,00	133,24	266,48	0,00	0%		2,00	100%		266,48	R\$	266,48
12.26	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 3/4"	89987	UN	4,00	75,32	301,28	0,00	0%		4,00	100%		301,28	R\$	301,28
12.27	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA 3/4"	89985	UN	3,00	71,60	214,80	0,00	0%		3,00	100%		214,80	R\$	214,80
12.28	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	102615	UN	1,00	1.267,45	1.267,45	0,00	0%		1,00	100%		1.267,45	R\$	1.267,45
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					6.622,46							6.622,46		6.622,46
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC					3.047,12							3.047,12		3.047,12
13.1.1	TUBO DE PVC SÉRIE R Ø100MM	89578	M	54,00	29,06	1.569,24	0,00	0%		54,00	100%		1.569,24	R\$	1.569,24
13.1.2	JOELHO 45° - 100MM	89746	UN	22,00	26,09	573,98	0,00	0%		22,00	100%		573,98	R\$	573,98
13.1.3	JOELHO 90° - 100MM	89744	UN	30,00	25,36	760,80	0,00	0%		30,00	100%		760,80	R\$	760,80
13.1.4	JUNÇÃO SIMPLES - 100MM - 100MM	89567	UN	2,00	71,55	143,10	0,00	0%		2,00	100%		143,10	R\$	143,10
13.2	ACESSÓRIOS					3.575,34							3.575,34		3.575,34
13.2.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 80X80X40 CM	97907	UN	6,00	595,89	3.575,34	0,00	0%		6,00	100%		3.575,34	R\$	3.575,34
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA					14.096,53							14.096,53		14.096,53
14.1	TUBO DE PVC RÍGIDO 100MM	89714	M	25,09	33,47	839,76	0,00	0%		25,09	100%		839,76	R\$	839,76
14.2	TUBO DE PVC RÍGIDO 40MM	89711	M	29,96	18,96	568,04	0,00	0%		29,96	100%		568,04	R\$	568,04
14.3	TUBO DE PVC RÍGIDO 50MM	89712	M	25,00	24,04	601,00	0,00	0%		25,00	100%		601,00	R\$	601,00
14.4	BUCHA DE REDUÇÃO PVC LONGA 50MM-40MM	103967	UN	2,00	10,13	20,26	0,00	0%		2,00	100%		20,26	R\$	20,26
14.5	JOELHO PVC 45° 100MM	89746	UN	3,00	26,09	78,27	0,00	0%		3,00	100%		78,27	R\$	78,27
14.6	JOELHO PVC 45° 50MM	89732	UN	7,00	14,46	101,22	0,00	0%		7,00	100%		101,22	R\$	101,22
14.7	JOELHO PVC 45° 40MM	89726	UN	10,00	9,07	90,70	0,00	0%		10,00	100%		90,70	R\$	90,70
14.8	JOELHO PVC 90° 50MM	89731	UN	3,00	13,82	41,46	0,00	0%		3,00	100%		41,46	R\$	41,46
14.9	JOELHO PVC 90° 40MM	89724	UN	2,00	8,86	17,72	0,00	0%		2,00	100%		17,72	R\$	17,72
14.10	JOELHO PVC 90° COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO 40MM - 1 1/2"	89724	UN	2,00	8,86	17,72	0,00	0%		2,00	100%		17,72	R\$	17,72
14.11	JUNÇÃO PVC SIMPLES 100MM-50MM	89569	UN	1,00	82,84	82,84	0,00	0%		1,00	100%		82,84	R\$	82,84
14.12	JUNÇÃO PVC SIMPLES 100MM-100MM	89690	UN	2,00	80,00	160,00	0,00	0%		2,00	100%		160,00	R\$	160,00
14.13	JUNÇÃO PVC SIMPLES 50MM-50MM	89785	UN	4,00	24,38	97,52	0,00	0%		4,00	100%		97,52	R\$	97,52
14.14	JUNÇÃO PVC SIMPLES 40MM-40MM	89561	UN	2,00	12,54	25,08	0,00	0%		2,00	100%		25,08	R\$	25,08
14.15	TÊ PVC SANITÁRIO 50MM-50MM	89784	UN	3,00	22,31	66,93	0,00	0%		3,00	100%		66,93	R\$	66,93
14.16	CURVA 90° CURTA 100 MM	89748	UN	7,00	38,61	270,27	0,00	0%		7,00	100%		270,27	R\$	270,27
14.17	CURVA 90° CURTA 40 MM	89728	UN	12,00	11,44	137,28	0,00	0%		12,00	100%		137,28	R\$	137,28
14.18	CURVA 90° LONGA 50 MM	89735	UN	3,00	23,20	69,60	0,00	0%		3,00	100%		69,60	R\$	69,60
14.19	CAIXA SIFONADA 100X100X50MM	89707	UN	6,00	46,60	279,60	0,00	0%		6,00	100%		279,60	R\$	279,60
14.20	CAIXA SIFONADA 150X150X50MM	89707	UN	1,00	46,60	46,60	0,00	0%		1,00	100%		46,60	R\$	46,60
14.21	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60CM	C0609	UN	3,00	348,00	1.044,00	0,00	0%		3,00	100%		1.044,00	R\$	1.044,00
14.22	TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM	C4822	UN	3,00	17,05	51,15	0,00	0%		3,00	100%		51,15	R\$	51,15
14.23	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUÍNTES), AF 12/2020	98083	UN	1,00	4.456,29	4.456,29	1,00	100%		1,00	100%		4.456,29	R\$	4.456,29
14.24	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUÍNTES), AF 12/2020 PA	98063	UN	1,00	4.933,22	4.933,22	1,00	100%		1,00	100%		4.933,22	R\$	4.933,22
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS					11.653,50							11.653,50		11.653,50
15.1	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL, DECA OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS	95470	UN	5,00	340,01	1.700,05	0,00	0%		5,00	0%		-	R\$	-
15.2	MICTÓRIO SIFONADO EM LOUÇA COM DESGARGA, DECA OU EQUIVALENTE	100858	UN	1,00	804,81	804,81	0,00	0%		1,00	0%		-	R\$	-


Lucas de B. Montalvão
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-MA: 111983915-7

15.3	VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO, DECA OU EQUIVALENTE	99635	UN	4,00	390,89	1.599,56	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$	-	R\$	-
15.4	VÁLVULA DE DESCARGA COM ACIONAMENTO POR LAVANCA, DECA OU EQUIVALENTE	99635	UN	1,00	390,89	390,89	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$	-	R\$	-
15.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, DECA OU EQUIVALENTE	86901	UN	6,00	162,04	972,24	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$	-	R\$	-
15.6	LAVATÓRIO PEQUENO COR BRANCO GELO, COM COLUNA SUSPensa, DECA OU EQUIVALENTE	86904	UN	1,00	162,18	162,18	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$	-	R\$	-
15.7	CHUVEIRO DE PLÁSTICO	C0797	UN	3,00	11,26	33,78	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$	-	R\$	-
15.8	PORTA PAPEL HIGIÊNICO, MELHORAMENTO OU EQUIVALENTE	96544	UN	4,00	77,30	309,20	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$	-	R\$	-
15.9	PAPELEIRA DE SOBREPOR INTERFOLHADO, MELHORAMENTO OU EQUIVALENTE	96547	UN	2,00	115,35	230,70	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$	-	R\$	-
15.10	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, DECA OU EQUIVALENTE	C1151	UN	2,00	66,23	130,46	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$	-	R\$	-
15.11	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA, DECA OU EQUIVALENTE	86906	UN	6,00	106,94	641,64	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$	-	R\$	-
15.12	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA, DECA OU EQUIVALENTE	86906	UN	1,00	106,94	106,94	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$	-	R\$	-
15.13	DISPENSER SABONETEIRA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE	96547	UN	4,00	115,35	461,40	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$	-	R\$	-
15.14	DISPENSER TOALHA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE	96547	UN	3,00	115,35	346,05	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$	-	R\$	-
15.15	CABIDE METÁLICO, DECA OU EQUIVALENTE	S03708	UN	2,00	113,46	226,92	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$	-	R\$	-
15.16	BARRA DE APOIO 40 CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE	100866	UN	3,00	324,32	972,96	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$	-	R\$	-
15.17	BARRA DE APOIO 60 CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE	100866	UN	1,00	324,32	324,32	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$	-	R\$	-
15.18	BARRA DE APOIO 80 CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE	100868	UN	3,00	359,27	1.077,81	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$	-	R\$	-
15.19	CADEIRA ARTICULADA PARA BANHO, DECA OU EQUIVALENTE	100875	UN	1,00	1.152,59	1.152,59	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$	-	R\$	-
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					3.262,04									0,00		0,00	
16.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE BLOCOS AUTÔNOMOS DE LED, COM AUTONOMIA DE 2H	97599	UN	12,00	21,39	256,68	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$	-	R\$	-
16.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE BLOCOS AUTÔNOMOS DE LED, TIPO REFLETOR	S07860	UN	4,00	295,75	1.183,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$	-	R\$	-
16.3	KIT BOTEIRA DE EMERGÊNCIA	S12514	UN	2,00	794,09	1.588,18	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$	-	R\$	-
16.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CM²	S13580	UN	18,00	13,01	234,18	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$	-	R\$	-
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V					31.407,60									7.429,18		10.458,58	
17.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO					638,65									0,00		0,00	
17.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COMPLETO, (PARA 18 DISJUNTORES) MONOPOLARES, COM BARRAMENTO PARA AS FASES, NEUTRO E PARA PROTEÇÃO METÁLICO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI COR BEGE, C/ PORTA, TRINCO E ACESSÓRIOS	101883	UN	1,00	511,58	511,58	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$	-	R\$	-
17.1.2	QUADRO DE MEDIÇÃO	101938	UN	1,00	127,07	127,07	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$	-	R\$	-
17.2	DISJUNTORES					490,98									0,00		0,00	
17.2.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10A	93653	UN	13,00	10,29	133,77	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$	-	R\$	-
17.2.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 13A	93654	UN	1,00	10,88	10,88	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$	-	R\$	-
17.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 32A	93657	UN	8,00	13,51	108,08	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$	-	R\$	-
17.2.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 50A	93673	UN	1,00	86,64	86,64	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$	-	R\$	-
17.2.5	INTERRUPTOR BIPOLAR DR - 25A	C4530	UN	1,00	151,61	151,61	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$	-	R\$	-
17.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					10.458,59									7.429,18		10.458,58	
17.3.1	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, Ø25MM (DN 3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	91834	M	270,40	17,82	4.818,53	170,00	63%	100,40	37%	270,40	100%	270,40	100%	R\$	1.789,13	R\$	4.818,53
17.3.2	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL, Ø40MM (DN 1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	91873	M	11,70	20,85	243,95	0,00	0%	11,70	100%	11,70	100%	11,70	100%	R\$	243,95	R\$	243,95
17.3.3	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL, Ø65MM (DN 3"), INCLUSIVE CONEXÕES	93011	M	60,00	45,21	2.712,60	0,00	0%	60,00	100%	60,00	100%	60,00	100%	R\$	2.712,60	R\$	2.712,60
17.3.4	LUBA PVC ROSCA 3/4"	91884	UN	2,00	11,12	22,24	0,00	0%	2,00	100%	2,00	100%	2,00	100%	R\$	22,24	R\$	22,24
17.3.5	LUBA PVC ROSCA 1 1/4"	91886	UN	103,00	15,39	1.585,17	0,00	0%	103,00	100%	103,00	100%	103,00	100%	R\$	1.585,17	R\$	1.585,17
17.3.6	LUBA PVC ROSCA 3"	93016	UN	13,00	38,74	503,62	0,00	0%	13,00	100%	13,00	100%	13,00	100%	R\$	503,62	R\$	503,62
17.3.7	CURVA 90° LONGA 1 1/4"	91920	UN	1,00	24,25	24,25	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100%	R\$	24,25	R\$	24,25
17.3.8	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4"	91943	UN	17,00	22,03	374,51	0,00	0%	17,00	100%	17,00	100%	17,00	100%	R\$	374,51	R\$	374,51
17.3.9	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR NO TETO AÇO PINTADA 100X100X80MM	92885	UN	2,00	13,74	27,48	0,00	0%	2,00	100%	2,00	100%	2,00	100%	R\$	27,48	R\$	27,48
17.3.10	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR PVC 150X150X68MM	C0627	UN	2,00	40,55	81,10	0,00	0%	2,00	100%	2,00	100%	2,00	100%	R\$	81,10	R\$	81,10
17.3.11	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR PVC 250X323X74MM	C0628	UN	1,00	65,14	65,14	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100%	R\$	65,14	R\$	65,14
17.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)					11.615,61									0,00		0,00	
17.4.1	CONDUTOR DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMAS, 450/750 V	91926	M	872,50	4,02	3.507,45	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$	-	R\$	-
17.4.2	CONDUTOR DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMAS, 450/750 V	91928	M	66,00	6,21	409,86	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$	-	R\$	-


Lucas de B. Montalvão
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-MA: 111983915-7

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Relatório fotográfico para 3ª medição realizada "in loco" na Quadra coberta no povoado rodeio, no município Chapadina - MA, 65500-000.



Imagem 1 – Execução da cobertura metálica.



Imagem 2 – Execução da cobertura metálica.


Lucas de B. Monteles
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA: 111983915-7



Imagem 3 - Execução do piso da quadra.

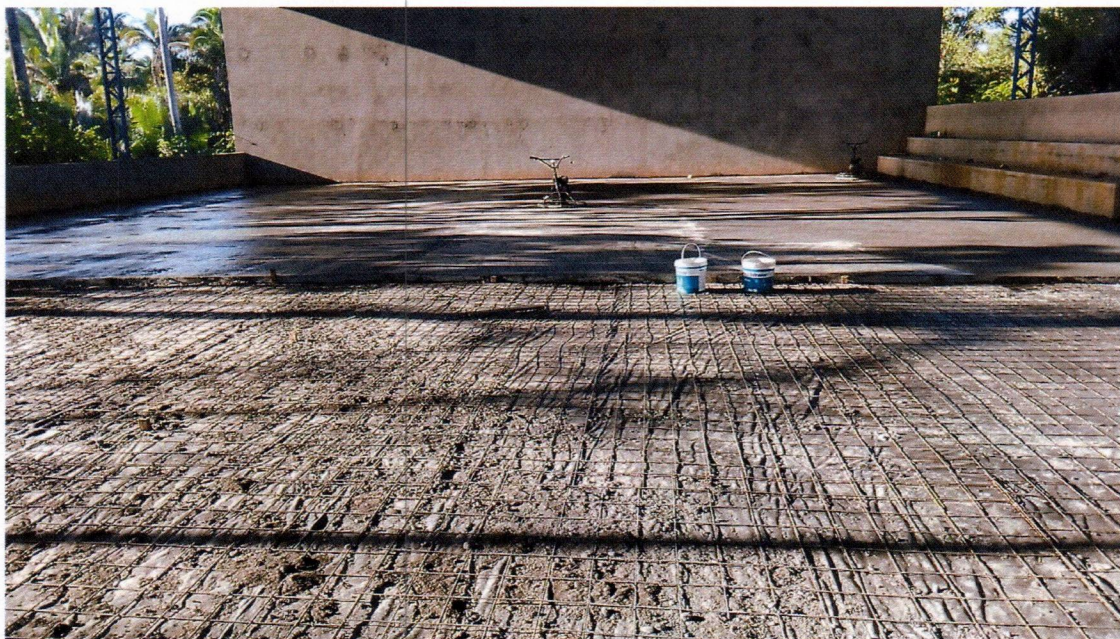


Imagem 4 – Execução do piso da quadra.

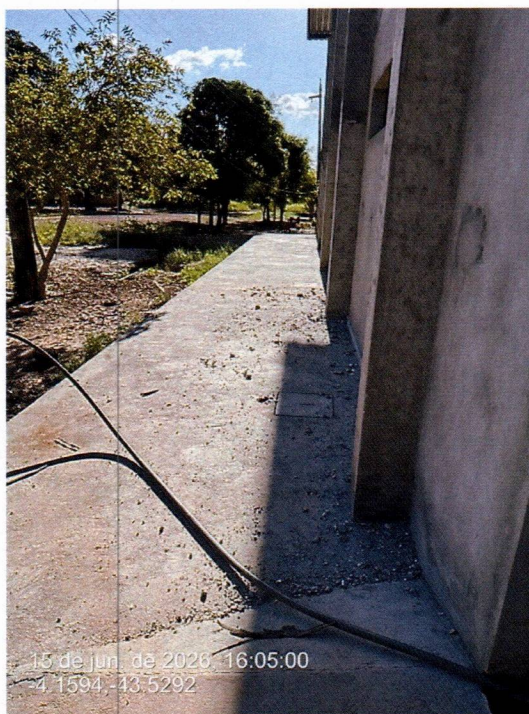


Imagem 5 – Execução da calçada externa.



Imagem 6 – Execução da do piso da arquibancada.



Imagem 7 – Execução do revestimento cerâmico nos banheiros.



Imagem 8 – Execução do revestimento cerâmico nos banheiros.



Imagem 9 – Execução da concretagem do piso da quadra.

META CONSTRUTORA E CONSULTORIA CNPJ: 39.590.842/0001-86 RUA 16, QD 37, Nº 07, RESIDENCIAL ESPLANADA, CHAPADINHA-MA CEP: 65500-000 META CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA																	
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA OBJETO : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM ARQUIBANCADA E VESTIÁRIOS NA U. I. RAIMUNDO TEXEIRA LISBOA NO POVOADO RODEIO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA - LOTE III																	
PERÍODO DE REFERÊNCIA A: 01/11/2025 A 10/10/2026																	
DATA: 10/07/2026																	
R\$ 565.663,71																	
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO																	
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL		
						QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDE NTE/ DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDE NTE/ DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				46.579,96										11.965,49	37.816,50	81,19%
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				25.407,58										11.965,49	20.394,12	80,27%
1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	66,00	98,99	6.533,34	21,50	33%		31,50	48%		53,00	80%		R\$ 3.118,19	R\$ 5.246,47	80,30%
1.1.2	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	704,00	26,81	18.874,24	235,00	33%		330,00	47%		565,00	80%		R\$ 8.847,30	R\$ 15.147,65	80,26%
1.2	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M. INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO. INSTALADA - REV 02 09/2021	UN	6,00	750,00	4.500,00	1,00	17%			0%		1,00	17%		R\$ -	R\$ 750,00	16,67%
1.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRAS. FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 07/2024. PE	M2	9,00	1.206,93	10.862,37	9,00	100%			0%		9,00	100%		R\$ -	R\$ 10.862,37	100,00%
1.4	LOCAÇÃO DA OBRA (EXECUÇÃO DE GABARITO)	M2	768,63	5,10	3.920,01	768,63	100%			0%		768,63	100%		R\$ -	R\$ 3.920,01	100,00%
1.5	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	M2	1.000,00	1,89	1.890,00	1.000,00	100%			0%		1000,00	100%		R\$ -	R\$ 1.890,00	100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES				22.198,48	0,00									0,00	22.198,48	100,00%
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 01/2024	M3	107,88	95,16	10.265,86	107,88	100%			0%		107,88	100%		R\$ -	R\$ 10.265,86	100,00%
2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	M2	53,03	2,86	151,67	53,03	100%			0%		53,03	100%		R\$ -	R\$ 151,67	100,00%
2.3	REATERRO MECANIZADO DE VALAS COM RETROESCAVADEIRA	M3	57,55	11,14	641,11	57,55	100%			0%		57,55	100%		R\$ -	R\$ 641,11	100,00%
2.4	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	115,20	96,70	11.139,84	115,20	100%			0%		115,20	100%		R\$ -	R\$ 11.139,84	100,00%
3	FUNDAÇÕES				82.742,42	0,00									0,00	82.742,42	100,00%
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS				59.553,55	0,00									0,00	59.553,55	100,00%
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL. ESPESURA 5CM - FUNDO DE VALA	M2	68,60	36,58	2.509,39	68,60	100%			0%		68,60	100%		R\$ -	R\$ 2.509,39	100,00%
3.1.2	FORMA DE MADEIRA EM TABUAS PARA FUNDAÇÕES. COM REAPROVEITAMENTO	M2	67,25	127,21	8.554,87	67,25	100%			0%		67,25	100%		R\$ -	R\$ 8.554,87	100,00%
3.1.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM. INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	986,55	11,85	11.690,62	986,55	100%			0%		986,55	100%		R\$ -	R\$ 11.690,62	100,00%
3.1.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM. INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	55,00	16,00	880,00	55,00	100%			0%		55,00	100%		R\$ -	R\$ 880,00	100,00%
3.1.5	CONCRETO BOMBADO FCK= 25MPa. INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	44,15	813,56	35.918,67	44,15	100%			0%		44,15	100%		R\$ -	R\$ 35.918,67	100,00%
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES				23.188,87	0,00									0,00	23.188,87	100,00%
3.2.1	LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL. ESPESURA 7CM. COM IMPERMEABILIZANTE - ENTRE BALDRAMES	M3	13,20	373,37	4.928,48	13,20	100%			0%		13,20	100%		R\$ -	R\$ 4.928,48	100,00%
3.2.2	FORMA DE MADEIRA EM TABUAS PARA FUNDAÇÕES. COM REAPROVEITAMENTO	M2	88,40	68,92	6.092,53	88,40	100%			0%		88,40	100%		R\$ -	R\$ 6.092,53	100,00%
3.2.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM. INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	307,20	13,53	4.156,42	307,20	100%			0%		307,20	100%		R\$ -	R\$ 4.156,42	100,00%

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO																	
CONTRATADO					ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANT.	%	EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	EXCDE NTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	EXCDE NTE/DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.	%
3.2.4	ARMADAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	144,45	11,85	1.711,73	144,45	100%			0%		144,45	100%		R\$ -	R\$ 1.711,73	100,00%
3.2.5	ARMADAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	132,10	16,00	2.113,60	132,10	100%			0%		132,10	100%		R\$ -	R\$ 2.113,60	100,00%
3.2.6	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	5,36	780,99	4.186,11	5,36	100%			0%		5,36	100%		R\$ -	R\$ 4.186,11	100,00%
4	SUPERESTRUTURA				378.099,81	0,00									298.961,05	378.099,80	100,00%
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES				25.438,45	0,00									0,00	25.438,45	100,00%
4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO	M2	121,10	47,33	5.731,66	121,10	100%			0%		121,10	100%		R\$ -	R\$ 5.731,66	100,00%
4.1.2	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	160,50	10,98	1.762,29	160,50	100%			0%		160,50	100%		R\$ -	R\$ 1.762,29	100,00%
4.1.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	605,00	9,24	5.590,20	605,00	100%			0%		605,00	100%		R\$ -	R\$ 5.590,20	100,00%
4.1.4	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	170,50	13,60	2.318,80	170,50	100%			0%		170,50	100%		R\$ -	R\$ 2.318,80	100,00%
4.1.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 02/2022	M3	10,30	974,32	10.035,50	10,30	100%			0%		10,30	100%		R\$ -	R\$ 10.035,50	100,00%
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS				29.586,88	0,00									0,00	29.586,88	100,00%
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO	M2	149,88	73,12	10.959,23	149,88	100%			0%		149,88	100%		R\$ -	R\$ 10.959,23	100,00%
4.2.2	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	10,68	12,96	138,41	10,68	100%			0%		10,68	100%		R\$ -	R\$ 138,41	100,00%
4.2.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	183,81	12,26	2.253,51	183,81	100%			0%		183,81	100%		R\$ -	R\$ 2.253,51	100,00%
4.2.4	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	203,64	10,98	2.235,97	203,64	100%			0%		203,64	100%		R\$ -	R\$ 2.235,97	100,00%
4.2.5	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	83,96	9,24	775,79	83,96	100%			0%		83,96	100%		R\$ -	R\$ 775,79	100,00%
4.2.6	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	152,78	13,60	2.077,81	152,78	100%			0%		152,78	100%		R\$ -	R\$ 2.077,81	100,00%
4.2.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 02/2022	M3	11,25	990,77	11.146,16	11,25	100%			0%		11,25	100%		R\$ -	R\$ 11.146,16	100,00%
4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS				881,30	0,00									0,00	881,30	100,00%
4.3.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTA	M	10,00	38,01	380,10	10,00	100%			0%		10,00	100%		R\$ -	R\$ 380,10	100,00%
4.3.2	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELA	M	10,00	50,12	501,20	10,00	100%			0%		10,00	100%		R\$ -	R\$ 501,20	100,00%
4.4	CONCRETO ARMADO - LAJE				9.810,00	0,00									0,00	9.810,00	100,00%
4.4.1	LAJE DE VIGOTA TRELIÇADA H=13CM	M2	50,00	196,20	9.810,00	50,00	100%			0%		50,00	100%		R\$ -	R\$ 9.810,00	100,00%
4.5	CONCRETO ARMADO - PISO				86.464,12	0,00									86.464,12	86.464,12	100,00%
4.5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO	M2	6,32	40,36	255,08	0,00	0%		6,32	100%		6,32	100%		R\$ 255,08	R\$ 255,08	100,00%
4.5.2	LASTRO DE BRITA COMPACTADA, ESPESURA 5CM	M3	34,00	137,96	4.690,64	0,00	0%		34,00	100%		34,00	100%		R\$ 4.690,64	R\$ 4.690,64	100,00%
4.5.3	LONA PLÁSTICA EM LAJE DE PISO DA QUADRA, ESPESURA 150 MICRAS	M2	680,00	6,91	4.698,80	0,00	0%		680,00	100%		680,00	100%		R\$ 4.698,80	R\$ 4.698,80	100,00%
4.5.4	ARMADAÇÃO EM TELA DE AÇO Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	KG	680,00	13,91	9.458,80	0,00	0%		680,00	100%		680,00	100%		R\$ 9.458,80	R\$ 9.458,80	100,00%

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO																		
CONTRATADO					ACUM. ANTERIOR				MEDIÇÃO ATUAL				ACUMULADO			VALOR FINAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANT.	%	EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	EXCEDE NTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	EXCEDENTE/DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.	%	
4.5.5	PISO EM CONCRETO 20MPA USINADO, ESPESSURA 8CM, INCLUSO SELANTE A BASE DE POLIURETANO (DIMENSÕES 1X1M, PARA JUNTA DE DILATAÇÃO)	M2	680,00	99,06	67.360,80	0,00	0%		680,00	100%		680,00	100%		R\$ 67.360,80	R\$ 67.360,80	100,00%	
4.6	ESTRUTURA METÁLICA				221.161,43	0,00									208.001,43	221.161,43	100,00%	
4.6.1	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA AÇO ASTM A36, INCLUSO PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS E PINTURA	KG	16.805,58	13,16	221.161,43	1.000,00	6%		15.805,58	94%		16805,58	100%		R\$ 208.001,43	R\$ 221.161,43	100,00%	
4.7	CONCRETO ARMADO - PISO/ASSENTO DA ARQUIBANCA DA				4.757,63	0,00									4.495,50	4.757,62	100,00%	
4.7.1	LASTRO DE BRITA COMPACTADA, ESPESSURA 5CM	M3	1,90	137,96	262,12	1,90	100%			0%		1,90	100%		R\$ -	R\$ 262,12	100,00%	
4.7.2	LONA PLÁSTICA EM LAJE DE PISO DA QUADRA, ESPESSURA 150 MICRAS	M2	37,50	6,91	259,13	0,00	0%		37,50	100%		37,50	100%		R\$ 259,13	R\$ 259,13	100,00%	
4.7.3	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	KG	37,50	13,91	521,63	0,00	0%		37,50	100%		37,50	100%		R\$ 521,63	R\$ 521,63	100,00%	
4.7.4	PISO EM CONCRETO 20MPA USINADO, ESPESSURA 8CM, INCLUSO SELANTE A BASE DE POLIURETANO (DIMENSÕES 1X1M, PARA JUNTA DE DILATAÇÃO)	M2	37,50	99,06	3.714,75	0,00	0%		37,50	100%		37,50	100%		R\$ 3.714,75	R\$ 3.714,75	100,00%	
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL				48.327,04	0,00									0,00	48.327,04	100,00%	
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				48.327,04	0,00									0,00	48.327,04	100,00%	
5.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 12/2021	M2	550,00	85,98	47.289,00	550,00	100%			0%		550,00	100%		R\$ -	R\$ 47.289,00	100,00%	
5.1.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA	M	67,10	15,47	1.038,04	67,10	100%			0%		67,10	100%		R\$ -	R\$ 1.038,04	100,00%	
6	ESQUADRIAS				13.336,41	0,00									0,00	0,00	0,00%	
6.1	PORTAS DE MADEIRA				4.891,48	0,00									0,00	0,00	0,00%	
6.1.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA - PM2A - 100X210 CM, LISA, SEM-OCAL PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL, INCLUSO FERRAGENS E FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	4,00	1.222,87	4.891,48	0,00	0%			0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%	
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS				474,87	0,00									0,00	0,00	0,00%	
6.2.1	BARRA DE APOIO 40 CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE - PM2	UN	1,00	324,32	324,32	0,00	0%			0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%	
6.2.2	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 90X40 CM, E= 1MM PARA AS PORTAS	M2	1,06	142,03	150,55	0,00	0%			0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%	
6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO				4.712,26	0,00									0,00	0,00	0,00%	
6.3.1	PORTA DE ABRIR - PM4 - 70X165 CM - VENEZIANA- CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	6,93	679,88	4.712,26	0,00	0%			0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%	
6.4	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA				1.717,43	0,00									0,00	0,00	0,00%	
6.4.1	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-02 - 120X60 CM, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO	M2	2,30	746,71	1.717,43	0,00	0%			0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%	
6.5	VIDROS				1.540,37	0,00									0,00	0,00	0,00%	
6.5.1	ESPELHO CRISTAL E=4MM SEM MOLDURA	M2	3,05	505,04	1.540,37	0,00	0%			0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%	
7	SISTEMAS DE COBERTURA				72.829,05	0,00									72.829,05	72.829,05	100,00%	
7.1	TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL - ESPESSURA 0,5MM	M2	933,00	72,97	68.081,01	0,00	0%		933,00	100%		933,00	100%		R\$ 68.081,01	R\$ 68.081,01	100,00%	
7.2	CALHA EM CHAPA METÁLICA DOBRADA, DESENVOLVIMENTO 40CM E=0,05MM	M	60,50	78,48	4.748,04	0,00	0%		60,50	100%		60,50	100%		R\$ 4.748,04	R\$ 4.748,04	100,00%	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO				4.363,75	0,00									0,00	4.363,75	100,00%	
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	75,20	42,17	3.171,18	75,20	100%			0%		75,20	100%		R\$ -	R\$ 3.171,18	100,00%	
8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	28,28	42,17	1.192,57	28,28	100%			0%		28,28	100%		R\$ -	R\$ 1.192,57	100,00%	
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO				53.060,64	0,00									11.585,44	53.060,64	100,00%	

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO																		
CONTRATADO					ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL				ACUMULADO			VALOR FINAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANT.	%	EXCEDENTE/ DIVERGENTE	QUANT.	%	EXCEDE NTE/ DIVERGE NTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDEN TE/ DIVERGEN TE	ATUAL	ACUM.	%	
9.1	CHAPISCO DE ADERÊNCIA EM PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, VIGAS, PLATIBANDA E CALHAS	M2	1.050,00	4,16	4.368,00	1.050,00	100%				0%		1050,00	100%		R\$ -	R\$ 4.368,00	100,00%
9.2	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS TRAÇO 1:2:9 - PREPARO MECÂNICO - ESPESSURA 2,0 CM	M2	1.050,00	35,68	37.464,00	1.040,00	99%		10,00	1%			1050,00	100%		R\$ 356,80	R\$ 37.464,00	100,00%
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV- CERÂMICA 32 X 45CM - INCL. REJUNTE	M2	103,52	74,05	7.665,66	0,00	0%		103,52	100%			103,52	100%		R\$ 7.665,66	R\$ 7.665,66	100,00%
9.4	PASTILHA CERÂMICA 10X10CM - VERMELHA	M2	12,02	151,81	1.824,76	0,00	0%		12,02	100%			12,02	100%		R\$ 1.824,76	R\$ 1.824,76	100,00%
9.5	PASTILHA CERÂMICA 10X10CM - AZUL	M2	11,45	151,81	1.738,22	0,00	0%		11,45	100%			11,45	100%		R\$ 1.738,22	R\$ 1.738,22	100,00%
10	SISTEMAS DE PISOS				38.369,47	0,00									11.246,22	11.246,22	29,31%	
10.1	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 4 CM - ÁREAS MOLHADAS	M2	50,00	38,36	1.918,00	0,00	0%		50,00	100%			50,00	100%		R\$ 1.918,00	R\$ 1.918,00	100,00%
10.2	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI AF 05/2021	M2	481,25	56,36	27.123,25	0,00	0%				0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%
10.3	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI V - 45 X 45 CM - INCL. REJUNTE	M2	50,00	74,77	3.738,50	0,00	0%		50,00	100%			50,00	100%		R\$ 3.738,50	R\$ 3.738,50	100,00%
10.4	RODAPE CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS DE DIMENSÕES 45X45 CM	M	9,60	9,36	89,86	0,00	0%		9,60	100%			9,60	100%		R\$ 89,86	R\$ 89,86	100,00%
10.5	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2 CM	M	4,60	118,43	544,78	0,00	0%		4,60	100%			4,60	100%		R\$ 544,78	R\$ 544,78	100,00%
10.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M3	6,60	750,77	4.955,08	0,00	0%		6,60	100%			6,60	100%		R\$ 4.955,08	R\$ 4.955,08	100,00%
11	PINTURAS E ACABAMENTOS				30.210,00	0,00										0,00	0,00	0,00%
11.1	EMASSAMENTO DE TETO COM MASSA CORRIDA PVA, 2 DEMÃOS	M2	50,00	16,07	803,50	0,00	0%				0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%
11.2	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM MASSA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS	M2	950,00	16,07	15.266,50	0,00	0%				0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%
11.3	PINTURA EM ACRÍLICO SOBRE TETO, 2 DEMÃOS	M2	50,00	14,14	707,00	0,00	0%				0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%
11.4	PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - BRANCO GEL, 2 DEMÃOS	M2	950,00	14,14	13.433,00	0,00	0%				0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				4.911,34	0,00									4.911,34	4.911,34	100,00%	
12.1	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM	M	71,18	4,93	350,92	0,00	0%		71,18	100%			71,18	100%		R\$ 350,92	R\$ 350,92	100,00%
12.2	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM	M	0,35	15,03	5,26	0,00	0%		0,35	100%			0,35	100%		R\$ 5,26	R\$ 5,26	100,01%
12.3	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM	M	15,27	16,63	253,94	0,00	0%		15,27	100%			15,27	100%		R\$ 253,94	R\$ 253,94	100,00%
12.4	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSAROSCA PARA REGISTRO - 25MM 3/4"	UN	31,00	5,62	174,22	0,00	0%		31,00	100%			31,00	100%		R\$ 174,22	R\$ 174,22	100,00%
12.5	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSAROSCA PARA REGISTRO - 50MM 1 1/2"	UN	14,00	9,08	127,12	0,00	0%		14,00	100%			14,00	100%		R\$ 127,12	R\$ 127,12	100,00%
12.6	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSAROSCA PARA REGISTRO - 50MM 1 1/4"	UN	7,00	12,66	88,62	0,00	0%		7,00	100%			7,00	100%		R\$ 88,62	R\$ 88,62	100,00%
12.7	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 60MM-50MM	UN	3,00	18,06	54,18	0,00	0%		3,00	100%			3,00	100%		R\$ 54,18	R\$ 54,18	100,00%
12.8	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50MM-25MM	UN	3,00	18,06	54,18	0,00	0%		3,00	100%			3,00	100%		R\$ 54,18	R\$ 54,18	100,00%
12.9	JOELHO 45 SOLDÁVEL - 25MM	UN	2,00	5,36	10,72	0,00	0%		2,00	100%			2,00	100%		R\$ 10,72	R\$ 10,72	100,00%
12.10	JOELHO 45 SOLDÁVEL - 75MM	UN	1,00	73,44	73,44	0,00	0%		1,00	100%			1,00	100%		R\$ 73,44	R\$ 73,44	100,00%
12.11	JOELHO 90 SOLDÁVEL - 25MM	UN	46,00	8,27	380,42	0,00	0%		46,00	100%			46,00	100%		R\$ 380,42	R\$ 380,42	100,00%
12.12	JOELHO 90 SOLDÁVEL - 50MM	UN	7,00	12,45	87,15	0,00	0%		7,00	100%			7,00	100%		R\$ 87,15	R\$ 87,15	100,00%
12.13	LUA SOLDÁVEL 25MM	UN	13,00	18,06	234,78	0,00	0%		13,00	100%			13,00	100%		R\$ 234,78	R\$ 234,78	100,00%
12.14	LUA SOLDÁVEL 50MM	UN	4,00	18,06	72,24	0,00	0%		4,00	100%			4,00	100%		R\$ 72,24	R\$ 72,24	100,00%
12.15	JOELHO 90 SOLDÁVEL COM ROSCA 25 X 3/4" MM	UN	1,00	11,55	11,55	0,00	0%		1,00	100%			1,00	100%		R\$ 11,55	R\$ 11,55	100,00%
12.16	JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO - 25MM - 3/4"	UN	10,00	11,55	115,50	0,00	0%		10,00	100%			10,00	100%		R\$ 115,50	R\$ 115,50	100,00%
12.17	JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO - 25MM - 1/2"	UN	7,00	27,07	189,49	0,00	0%		7,00	100%			7,00	100%		R\$ 189,49	R\$ 189,49	100,00%
12.18	TÊ 90 SOLDÁVEL 25MM	UN	6,00	11,39	68,34	0,00	0%		6,00	100%			6,00	100%		R\$ 68,34	R\$ 68,34	100,00%
12.19	TÊ SOLDÁVEL 50MM	UN	2,00	19,78	39,56	0,00	0%		2,00	100%			2,00	100%		R\$ 39,56	R\$ 39,56	100,00%

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO															
CONTRATADO					ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL	
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	QUANT. EXCEDE NTE/ DIVERGE NTE	%	QUANT. TE/ DIVERGEN TE	ATUAL	ACUM.	%	
12.20	TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50MM - 25MM	UN	3,00	17,60	52,80	0,00	0%		3,00	100%		R\$ 52,80	R\$ 52,80	100,00%	
12.21	ENGATE FLEXIVEL PLÁSTICO 1/2" - 30CM	UN	10,00	9,53	95,30	0,00	0%		10,00	100%		R\$ 95,30	R\$ 95,30	100,00%	
12.22	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO BOLSA CENTRAL - 25MM - 3/4"	UN	3,00	19,76	59,28	0,00	0%		3,00	100%		R\$ 59,28	R\$ 59,28	100,00%	
12.23	REGISTRO DE ESFERA 3/4"	UN	1,00	31,42	31,42	0,00	0%		1,00	100%		R\$ 31,42	R\$ 31,42	100,00%	
12.24	REGISTRO BRUTO DE GAVETA 2 1/2"	UN	1,00	230,90	230,90	0,00	0%		1,00	100%		R\$ 230,90	R\$ 230,90	100,00%	
12.25	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPIA CROMADA 1 1/2"	UN	2,00	133,24	266,48	0,00	0%		2,00	100%		R\$ 266,48	R\$ 266,48	100,00%	
12.26	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPIA CROMADA 3/4"	UN	4,00	75,32	301,28	0,00	0%		4,00	100%		R\$ 301,28	R\$ 301,28	100,00%	
12.27	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO. 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	71,60	214,80	0,00	0%		3,00	100%		R\$ 214,80	R\$ 214,80	100,00%	
12.28		UN	1,00	1.267,45	1.267,45	0,00	0%		1,00	100%		R\$ 1.267,45	R\$ 1.267,45	100,00%	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				6.622,46	0,00						6.622,46		100,00%	
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC				3.047,12	0,00						3.047,12		100,00%	
13.1.1	TUBO DE PVC SÉRIE R Ø100MM	M	54,00	29,06	1.569,24	0,00	0%		54,00	100%		R\$ 1.569,24	R\$ 1.569,24	100,00%	
13.1.2	JOELHO 45° - 100MM	UN	22,00	26,09	573,98	0,00	0%		22,00	100%		R\$ 573,98	R\$ 573,98	100,00%	
13.1.3	JOELHO 90° - 100MM	UN	30,00	25,36	760,80	0,00	0%		30,00	100%		R\$ 760,80	R\$ 760,80	100,00%	
13.1.4	JUNÇÃO SIMPLES - 100MM - 100MM	UN	2,00	71,55	143,10	0,00	0%		2,00	100%		R\$ 143,10	R\$ 143,10	100,00%	
13.2	ACESSÓRIOS				3.575,34	0,00						3.575,34		100,00%	
13.2.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 80X80X40 CM	UN	6,00	595,89	3.575,34	0,00	0%		6,00	100%		R\$ 3.575,34	R\$ 3.575,34	100,00%	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				14.096,53	0,00						14.096,53		100,00%	
14.1	TUBO DE PVC RÍGIDO 100MM	M	25,09	33,47	839,76	0,00	0%		25,09	100%		R\$ 839,76	R\$ 839,76	100,00%	
14.2	TUBO DE PVC RÍGIDO 40MM	M	29,96	18,96	568,04	0,00	0%		29,96	100%		R\$ 568,04	R\$ 568,04	100,00%	
14.3	TUBO DE PVC RÍGIDO 50MM	M	25,00	24,04	601,00	0,00	0%		25,00	100%		R\$ 601,00	R\$ 601,00	100,00%	
14.4	BUCHA DE REDUÇÃO PVC LONGA 50MM-40MM	UN	2,00	10,13	20,26	0,00	0%		2,00	100%		R\$ 20,26	R\$ 20,26	100,00%	
14.5	JOELHO PVC 45° 100MM	UN	3,00	26,09	78,27	0,00	0%		3,00	100%		R\$ 78,27	R\$ 78,27	100,00%	
14.6	JOELHO PVC 45° 50MM	UN	7,00	14,46	101,22	0,00	0%		7,00	100%		R\$ 101,22	R\$ 101,22	100,00%	
14.7	JOELHO PVC 45° 40MM	UN	10,00	9,07	90,70	0,00	0%		10,00	100%		R\$ 90,70	R\$ 90,70	100,00%	
14.8	JOELHO PVC 90° 50MM	UN	3,00	13,82	41,46	0,00	0%		3,00	100%		R\$ 41,46	R\$ 41,46	100,00%	
14.9	JOELHO PVC 90° 40MM	UN	2,00	8,86	17,72	0,00	0%		2,00	100%		R\$ 17,72	R\$ 17,72	100,00%	
14.10	JOELHO PVC 90° COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO 40MM - 1 1/2"	UN	2,00	8,86	17,72	0,00	0%		2,00	100%		R\$ 17,72	R\$ 17,72	100,00%	
14.11	JUNÇÃO PVC SIMPLES 100MM-50MM	UN	1,00	82,84	82,84	0,00	0%		1,00	100%		R\$ 82,84	R\$ 82,84	100,00%	
14.12	JUNÇÃO PVC SIMPLES 100MM-100MM	UN	2,00	80,00	160,00	0,00	0%		2,00	100%		R\$ 160,00	R\$ 160,00	100,00%	
14.13	JUNÇÃO PVC SIMPLES 50MM-50MM	UN	4,00	24,38	97,52	0,00	0%		4,00	100%		R\$ 97,52	R\$ 97,52	100,00%	
14.14	JUNÇÃO PVC SIMPLES 40MM-40MM	UN	2,00	12,54	25,08	0,00	0%		2,00	100%		R\$ 25,08	R\$ 25,08	100,00%	
14.15	TÊ PVC SANITÁRIO 50MM-50MM	UN	3,00	22,31	66,93	0,00	0%		3,00	100%		R\$ 66,93	R\$ 66,93	100,00%	
14.16	CURVA 90° CURTA 100 MM	UN	7,00	38,61	270,27	0,00	0%		7,00	100%		R\$ 270,27	R\$ 270,27	100,00%	
14.17	CURVA 90° CURTA 40 MM	UN	12,00	11,44	137,28	0,00	0%		12,00	100%		R\$ 137,28	R\$ 137,28	100,00%	
14.18	CURVA 90° LONGA 50 MM	UN	3,00	23,20	69,60	0,00	0%		3,00	100%		R\$ 69,60	R\$ 69,60	100,00%	
14.19	CAIXA SIFONADA 100X100X50MM	UN	6,00	46,60	279,60	0,00	0%		6,00	100%		R\$ 279,60	R\$ 279,60	100,00%	
14.20	CAIXA SIFONADA 150X150X50MM	UN	1,00	46,60	46,60	0,00	0%		1,00	100%		R\$ 46,60	R\$ 46,60	100,00%	
14.21	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60CM	UN	3,00	348,00	1.044,00	0,00	0%		3,00	100%		R\$ 1.044,00	R\$ 1.044,00	100,00%	
14.22	TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM	UN	3,00	17,05	51,15	0,00	0%		3,00	100%		R\$ 51,15	R\$ 51,15	100,00%	
14.23	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M. VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF- 12/2020	UN	1,00	4.456,29	4.456,29	1,00	100%			0%		R\$ -	R\$ 4.456,29	100,00%	

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO														
CONTRATADO					ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO		VALOR FINAL	
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANT.	%	EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.	%
14.24	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUÍVEIS), AF_12/2020_PA	UN	1,00	4.933,22	4.933,22	1,00	100%		1,00	100%		R\$ -	R\$ 4.933,22	100,00%
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS				11.653,50	0,00						0,00	0,00	0,00%
15.1	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL, DECA OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS	UN	5,00	340,01	1.700,05	0,00	0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%
15.2	MICTÓRIO SIFONADO EM LOUÇA COM DESGARGA, DECA OU EQUIVALENTE	UN	1,00	804,81	804,81	0,00	0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%
15.3	VALVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO, DECA OU EQUIVALENTE	UN	4,00	399,89	1.599,56	0,00	0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%
15.4	VALVULA DE DESCARGA COM ACIONAMENTO POR LAVANCA, DECA OU EQUIVALENTE	UN	1,00	399,89	399,89	0,00	0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%
15.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, DECA OU EQUIVALENTE	UN	6,00	162,04	972,24	0,00	0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%
15.6	LAVATÓRIO PEQUENO COR BRANCO GELO, COM COLUNA SUSPensa, DECA OU EQUIVALENTE	UN	1,00	162,18	162,18	0,00	0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%
15.7	CHUVEIRO DE PLÁSTICO	UN	3,00	11,26	33,78	0,00	0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%
15.8	PORTA PAPEL HIGIÊNICO, MELHORAMENTO OU EQUIVALENTE	UN	4,00	77,30	309,20	0,00	0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%
15.9	PAPELEIRA DE SOBREPOR INTERFOLHADO, MELHORAMENTO OU EQUIVALENTE	UN	2,00	115,35	230,70	0,00	0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%
15.10	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, DECA OU EQUIVALENTE	UN	2,00	65,23	130,46	0,00	0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%
15.11	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA, DECA OU EQUIVALENTE	UN	6,00	106,94	641,64	0,00	0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%
15.12	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA, DECA OU EQUIVALENTE	UN	1,00	106,94	106,94	0,00	0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%
15.13	DISPENSER SABONETEIRA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE	UN	4,00	115,35	461,40	0,00	0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%
15.14	DISPENSER TOALHA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE	UN	3,00	115,35	346,05	0,00	0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%
15.15	CABIDE METÁLICO, DECA OU EQUIVALENTE	UN	2,00	113,46	226,92	0,00	0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%
15.16	BARRA DE APOIO 40 CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE	UN	3,00	324,32	972,96	0,00	0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%
15.17	BARRA DE APOIO 60 CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE	UN	1,00	324,32	324,32	0,00	0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%
15.18	BARRA DE APOIO 80 CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE	UN	3,00	359,27	1.077,81	0,00	0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%
15.19	CADEIRA ARTICULADA PARA BANHO, DECA OU EQUIVALENTE	UN	1,00	1.152,59	1.152,59	0,00	0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				3.262,04	0,00						0,00	0,00	0,00%
16.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE BLOCOS AUCÔNOMOS DE LED, COM AUTONOMIA DE 2H	UN	12,00	21,39	256,68	0,00	0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%
16.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE BLOCOS AUCÔNOMOS DE LED, TIPO REFLETOR	UN	4,00	295,75	1.183,00	0,00	0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%
16.3	KIT BOTOEIRA DE EMERGENCIA	UN	2,00	794,09	1.588,18	0,00	0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%
16.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480x60"	UN	18,00	13,01	234,18	0,00	0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V				31.407,60	0,00						7.429,18	10.458,58	33,30%
17.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO				638,65	0,00						0,00	0,00	0,00%
17.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COMPLETO (PARA 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM BARRAMENTO PARA AS FASES, NEUTRO E PARA PROTEÇÃO, METÁLICO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI COR BEGE, C/ PORTA, TRINCO E ACESSÓRIOS)	UN	1,00	511,58	511,58	0,00	0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%
17.1.2	QUADRO DE MEDIÇÃO	UN	1,00	127,07	127,07	0,00	0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%
17.2	DISJUNTORES				490,98	0,00						0,00	0,00	0,00%
17.2.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10A	UN	13,00	10,29	133,77	0,00	0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%
17.2.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 13A	UN	1,00	10,88	10,88	0,00	0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%
17.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 32A	UN	8,00	13,51	108,08	0,00	0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%
17.2.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 50A	UN	1,00	86,64	86,64	0,00	0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO																
CONTRATADO					ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANT.	%	EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	EXCEDE NTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	EXCEDENTE/DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.
17.2.5	INTERRUPTOR BIPOLAR DR - 25A	UN	1,00	151,61	151,61	0,00	0%			0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -
17.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				10.458,59	0,00									7.429,18	10.458,58
17.3.1	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, Ø25MM (DN 3/4")	M	270,40	17,82	4.818,53	170,00	63%		100,40	37%		270,40	100%		R\$ 1.789,13	R\$ 4.818,53
17.3.2	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL, Ø40MM (DN 1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	11,70	20,85	243,95	0,00	0%		11,70	100%		11,70	100%		R\$ 243,95	R\$ 243,95
17.3.3	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL, Ø85MM (DN 3"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	60,00	45,21	2.712,60	0,00	0%		60,00	100%		60,00	100%		R\$ 2.712,60	R\$ 2.712,60
17.3.4	LUVA PVC ROSCA 3/4"	UN	2,00	11,12	22,24	0,00	0%		2,00	100%		2,00	100%		R\$ 22,24	R\$ 22,24
17.3.5	LUVA PVC ROSCA 1 1/4"	UN	103,00	15,39	1.585,17	0,00	0%		103,00	100%		103,00	100%		R\$ 1.585,17	R\$ 1.585,17
17.3.6	LUVA PVC ROSCA 3"	UN	13,00	38,74	503,62	0,00	0%		13,00	100%		13,00	100%		R\$ 503,62	R\$ 503,62
17.3.7	CURVA 90° LONGA 1 1/4"	UN	1,00	24,25	24,25	0,00	0%		1,00	100%		1,00	100%		R\$ 24,25	R\$ 24,25
17.3.8	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4"	UN	17,00	22,03	374,51	0,00	0%		17,00	100%		17,00	100%		R\$ 374,51	R\$ 374,51
17.3.9	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR NO TETO AÇO PINTADA 100X100X80MM	UN	2,00	13,74	27,48	0,00	0%		2,00	100%		2,00	100%		R\$ 27,48	R\$ 27,48
17.3.10	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR PVC 150X150X68MM	UN	2,00	40,55	81,10	0,00	0%		2,00	100%		2,00	100%		R\$ 81,10	R\$ 81,10
17.3.11	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR PVC 250X323X74MM	UN	1,00	65,14	65,14	0,00	0%		1,00	100%		1,00	100%		R\$ 65,14	R\$ 65,14
17.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)				11.615,61	0,00									0,00	0,00%
17.4.1	CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMAS, 450/750 V	M	872,50	4,02	3.507,45	0,00	0%			0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -
17.4.2	CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMAS, 450/750 V	M	66,00	6,21	409,86	0,00	0%			0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -
17.4.3	CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMAS, 450/750 V	M	286,75	8,69	2.491,86	0,00	0%			0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -
17.4.4	CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16,0 MM², ANTI-CHAMAS, 450/750 V	M	231,50	22,49	5.206,44	0,00	0%			0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -
17.5	ILUMINAÇÃO E TOMADAS				8.203,77	0,00									0,00	0,00%
17.5.1	TOMADA UNIVERSAL, 10A, COR BRANCA, COMPLETA	UN	7,00	35,09	245,63	0,00	0%			0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -
17.5.2	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	6,00	29,97	179,82	0,00	0%			0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -
17.5.3	LUMINARIAS LED SOBREPOR 270X1250MM, 18W	UN	8,00	309,24	2.473,92	0,00	0%			0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -
17.5.4	REFLETOR LED 200W	UN	20,00	265,22	5.304,40	0,00	0%			0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				24.089,35	0,00									14.726,79	14.726,79
18.1	CONNECTOR TIPO TERMINAL OLHAL PARA CABO #50 MM²	UN	15,00	7,21	108,15	0,00	0%		7,00	47%		7,00	47%		R\$ 50,47	R\$ 50,47
18.2	CONNECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO TIPO U COM DUPLA ROSCA	UN	18,00	25,16	452,88	0,00	0%		18,00	100%		18,00	100%		R\$ 452,88	R\$ 452,88
18.3	HASTE DE COBRE 2,4 M X 5/8" COPPERWELD	UN	18,00	84,22	1.515,96	0,00	0%		18,00	100%		18,00	100%		R\$ 1.515,96	R\$ 1.515,96
18.4	CABO DE COBRE NU 50MM²	M	255,00	84,00	21.420,00	0,00	0%		150,00	59%		150,00	59%		R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00
18.5	CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA EM PVC, Ø 230MM X 250MM	UN	4,00	53,74	214,96	0,00	0%		2,00	50%		2,00	50%		R\$ 107,48	R\$ 107,48
18.6	PARAFUSO 5/16" INOX CABEÇA SEXTAVADA COM ARRUELA	UN	15,00	25,16	377,40	0,00	0%			0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				59.882,37	0,00									0,00	0,00%
19.1	BANCADEA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO	M2	5,00	386,96	1.934,80	0,00	0%			0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -
19.2	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - E=2 CM	M2	16,00	800,83	12.813,28	0,00	0%			0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -
19.3	PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA= 19CM E=2 CM	M	10,80	88,89	960,01	0,00	0%			0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -
19.4	CONJUNTO DE MASTROS PARA BANDEIRAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	UN	1,00	3.893,45	3.893,45	0,00	0%			0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -
19.5	ESTRUTURA METÁLICA PARA REDE DE VOLEY	CJ	1,00	2.703,16	2.703,16	0,00	0%			0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -
19.6	ESTRUTURA METÁLICA COM TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,00	5.131,05	5.131,05	0,00	0%			0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -
19.7	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,00	4.452,67	4.452,67	0,00	0%			0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO																	
CONTRATADO						ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANT.	%	EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	EXCEDE NTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	EXCEDENTE/DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.	%
19.8	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	171,50	163,23	27.993,95	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	
20	SERVIÇOS FINAIS				3.574,66	0,00									0,00	0,00	0,00%
20.1	LIMPEZA DE OBRA	M2	768,63	1,94	1.491,14	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%
20.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 0,47X0,57M	UN	1,00	2.083,52	2.083,52	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		R\$ -	R\$ -	0,00%
VALOR TOTAL SEM DBI					R\$ 949.616,88										R\$ 444.984,04	R\$ 761.499,61	80,19%
BDI 27,12%					R\$ 257.536,10			0,00%		46,86%			46,86%		R\$ 120.679,67	R\$ 206.518,69	80,19%
VALOR TOTAL:					R\$ 1.207.152,98								46,86%		R\$ 565.663,71	R\$ 968.018,30	80,19%
VALOR DA 3ª MEDIÇÃO R\$ 565.663,71 (QUINHENTO E SESENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)																	
VALOR DA OBRA: R\$ 1.207.152,98 (UM MILHÃO DUZENTOS E SETE MIL CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS.)																	
SALDO DA PROPOSTA: R\$ 239.134,67																	

JULIO ENRIKY
SENA DE
OLIVEIRA:020
28818301

Assinado de forma
digital por JULIO
ENRIKY SENA DE
OLIVEIRA:02028818301
Dados: 2026.07.10
11:18:59 -03'00'

KERLLY KAIO
DE LIMA DA
CONCEICAO: 6327
05382356327

Assinado de forma
digital por KERLLY
KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:0538235
6327
Dados: 2026.07.10
11:25:08 -03'00'



META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
COBERTA COM ARQUIBANCADA E VESTIÁRIOS NA U. I. RAIMUNDO TEXEIRA LISBOA NO POVOADO
RODEIO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA - LOTE III**

CONTRATO: Nº 268/2024, CONCORRÊNCIA-024/2024

**O presente relatório tem por objetivo demonstrar os serviços que foram realizados
referente ao 3º boletim de medição.**



Imagem 01 – Serviços reboco e arquibancadas



META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

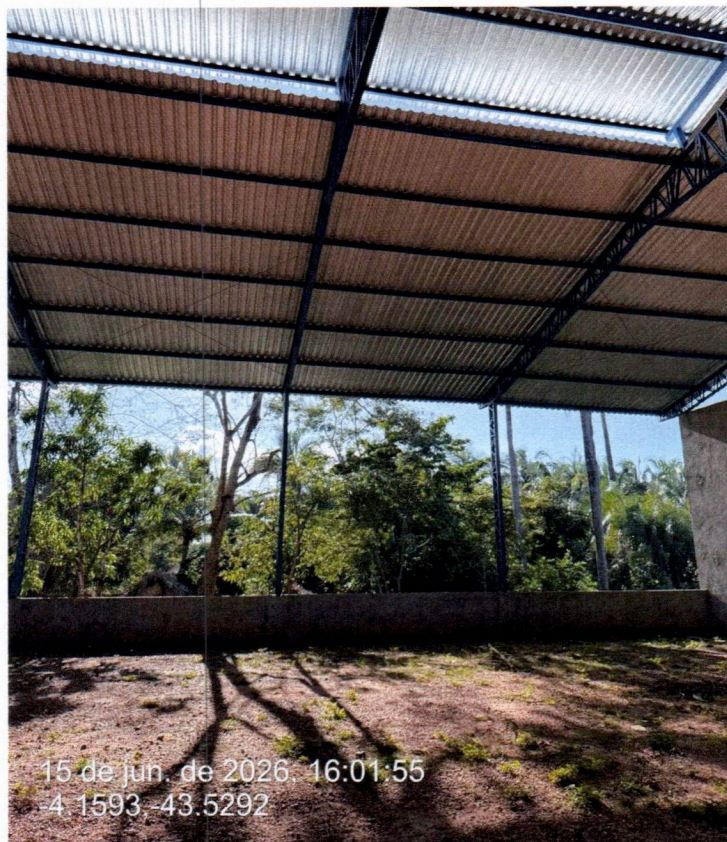


Imagem 02 – Serviços de cobertura metálica



Imagem 03 – Serviços de cobertura metálica



META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

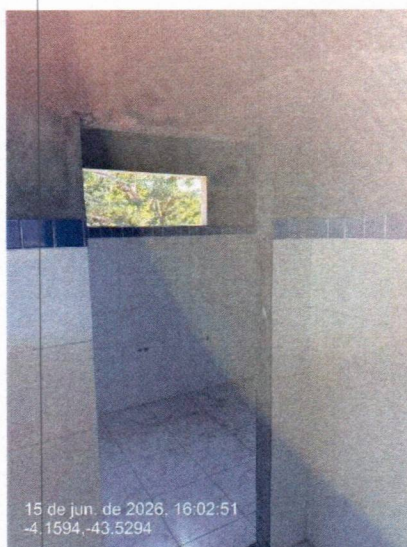


Imagem 04 – Serviços revestimentos cerâmicos



Imagem 05 – Serviços de reboco e cobertura metálica



META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86



Imagem 06 – Serviços de SPDA



Imagem 07 – Serviços de SPDA



META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86



Imagem 08 – Serviços de revestimentos cerâmicos

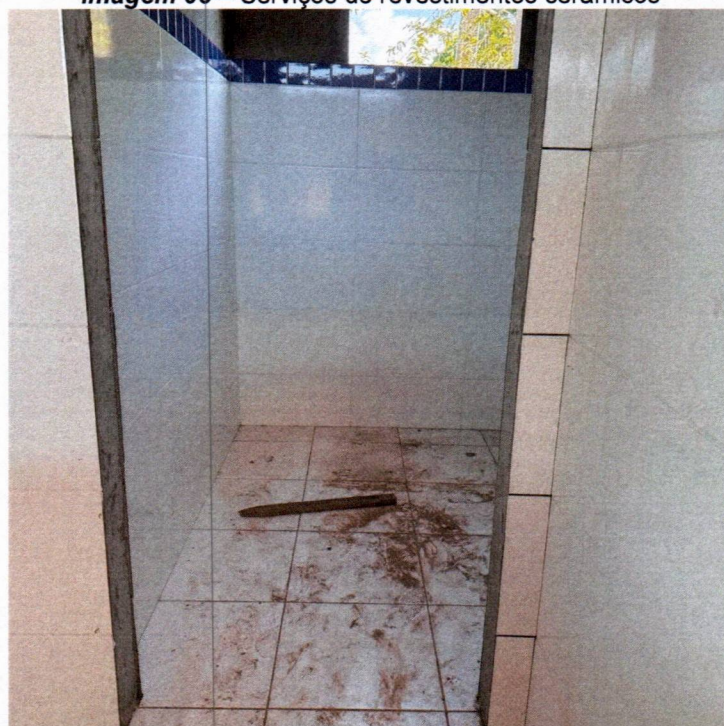


Imagem 9 – Serviços de revestimento cerâmicos



META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

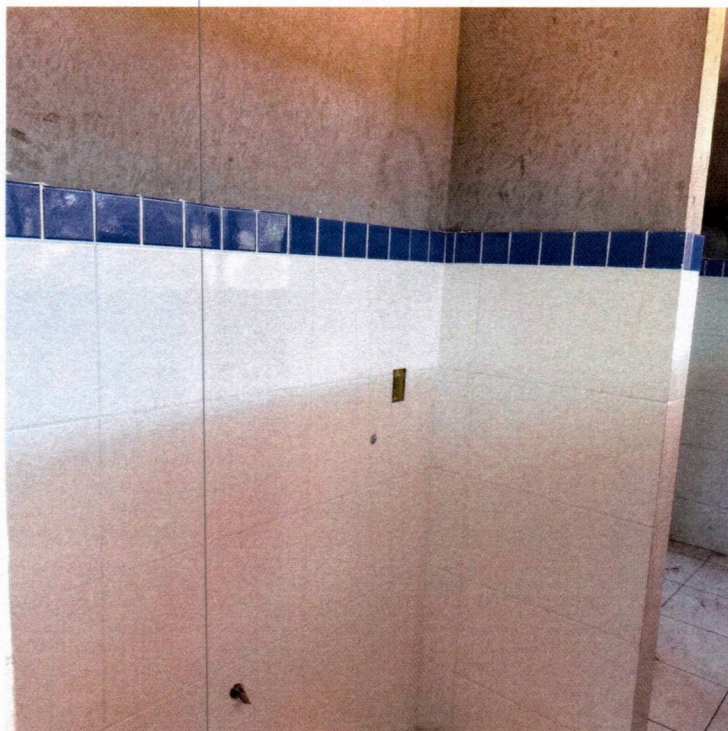


Imagem 10 – Serviços de revestimentos cerâmicos

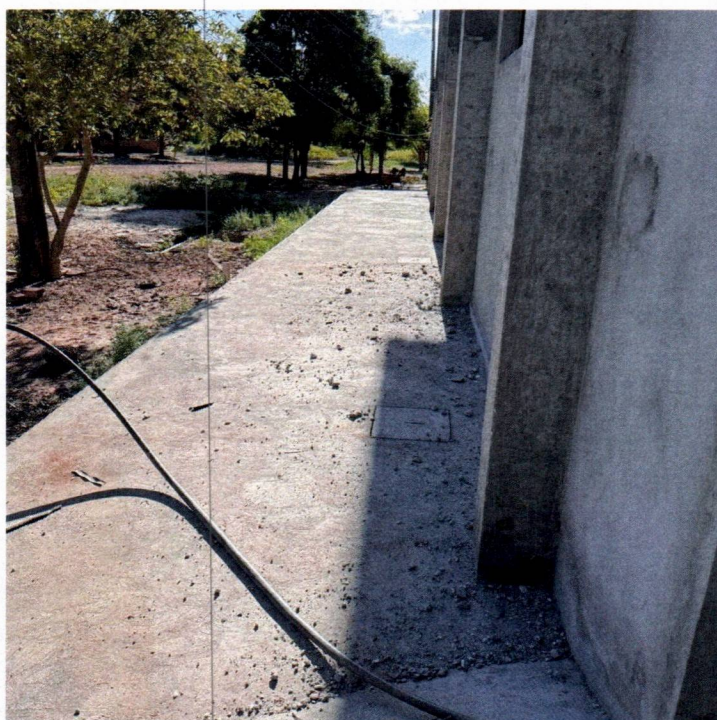


Imagem 11 – Serviços de calçadas



META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86



Imagem 12 – Serviços de calçadas



Imagem 13 – Serviços de arquibancadas



META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86



Imagem 14 – Serviços de piso de concreto



Imagem 15 – Serviços de piso de concreto



META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86



Imagem 16 – Serviços de piso de concreto



Imagem 17 – Serviços de piso de concreto

**JULIO ENRIKY
SENA DE
OLIVEIRA:0202881
8301**

Assinado de forma digital
por JULIO ENRIKY SENA DE
OLIVEIRA:02028818301
Dados: 2026.07.10 11:19:32
-03'00'

Chapadinha-MA 10 de julho de 2026

**KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:0538235632**

Assinado de forma digital por
KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
Dados: 2026.07.10 11:24:41 -03'00'

Ofício nº 040/2026

Chapadinha – MA, 10 de julho de 2025

Ilma, Senhora

NARA DA SILVA MACEDO

Secretária Municipal de Educação

Chapadinha - MA

Solicitação de Pagamento

A empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na Rua 16, QD 37, nº 07, Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **39.590.842/0001-86**, através do seu sócio administrador kerlly Kaio de Lima da Conceição, CPF 053.823.563-27, RG 04313313201-1, detentora do contrato de Nº 268/2024, CONCORRÊNCIA-024/2024, processo administrativo 3228/2024, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, solicitar o pagamento da NFS-e nº 202500000000074, no valor de R\$ 565.663,71 (quinhentos e sessenta e cinco mil e seiscentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos), referente a 3ª medição dos SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM ARQUIBANCADA E VESTIÁRIOS NA U. I. RAIMUNDO TEXEIRA LISBOA NO POVOADO RODEIO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA - LOTE III, do referido contrato.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1773-6

CONTA: 65422-1

KERLLY KAIO DE LIMA
DA
CONCEICAO:053823563
27

Assinado de forma digital por
KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
Dados: 2026.07.10 15:55:34
-03'00'

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
(SÓCIO ADMINISTRADOR)



PREFEITURA DE CHAPADINHA

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



142.04

IDENTIFICAÇÃO DA NOTA

Chave de Acesso da NFS-e

21032081239590842000186202600000007426070000000740

Número da Nota
2026000000074

Data de Emissão
10/07/2026 15:33:29

Competência
07/2026

Número da DPS
2026000000074

Série DPS
900

Data de Emissão DPS
10/07/2026 15:33:30

Número da Nota
2026000000074
Código de Verificação
JDEJ-N5DI

TRIBUTAÇÃO

Tributação
TRIBUTÁVEL

Local de Tributação
LOCAL DA PRESTACAO

Local da Prestação
CHAPADINHA/MA

Natureza da Operação
EXIGIVEL

Cod. Benefício Fiscal

Incidência
SIM

Município de Incidência
CHAPADINHA

ISS Retido
SIM

Responsável pela retenção

Exigibilidade do ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

Endereço

RUA 16, RESIDENCIAL ESPLANADA 07 - BAIRRO BOA VISTA - CEP:65.500-000 - CHAPADINHA/MA

CPF/CNPJ

39.590.842/0001-86

Insc Municipal

3399

Insc Estadual

Telefone

9892251962

E-mail

sousalucas177@gmail.com

Opt. Simples

NÃO

Indicador de MEI

NÃO

Natureza Jurídica

Regime Especial de Tributação

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA - MA

CPF/CNPJ

30.887.156/0001-05

Insc Municipal

Endereço

AVENIDA SENADOR VITÓRINO FREIRE,1042 - TERRAS DURAS, CHAPADINHA/MA - CEP: 65500000

Telefone

000000000000

E-mail

chapadinhasenhas@hotmail.com

Tomador estrangeiro

NÃO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NBS

1.0101.29.00:Serviços de construção de edificações não residenciais não classificados em subposições anteriores

Serviço

0702 : EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO,

Atividade

4120400 : CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Descrição

3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM ARQUIBANCADA E VESTIÁRIOS NA U. I. RAIMUNDO TEXEIRA LISBOA NO POVOADO RODEIO NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA - LOTE III CONTRATO: Nº268/2024 CONCORRÊNCIA Nº 024/2024

DADOS DA OBRA

Código da Obra MA20250956291

Inscrição Imobiliária

CCIB:

Endereço POVOADO RODEIO, SN

Complemento

Bairro ZONA RURAL

CEP/End Postal 65.500-000

Município/UF CHAPADINHA / MA

MAPA DE DEDUÇÕES

Tipo Dedução	CPF/CNPJ Prestador	Número NF	Valor Total (R\$)	Valor Dedução (R\$)
DESPESAS COM MATERIAIS		16378	280.000,00	226.260,00
				226.260,00

OBSERVAÇÕES DA NOTA

VALOR A SER DEPOSITADO NO BANCO DO BRASIL

AG: 1773-6

CC: 65.422-1

VALORES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - NFSe							
Valor dos Serviços R\$ 565.663,71		Deduções R\$ 226.260,00	Acréscimos R\$ 0,00	Desc. Condic. R\$ 0,00	Desc. Incondic. R\$ 0,00	Crédito R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00
COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 6.787,96	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	Valor IBS Mun. R\$ 565,66	Valor IBS Estadu. R\$ 0,00	Valor CBS R\$ 5.090,97
Base de Cálculo R\$ 339.403,71		Alíquota 5,00 %	ISS R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 16.970,19	Total das Ret. R\$ 23.758,15	Valor Líquido R\$ 541.905,56	

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Chave de Acesso: 21032081239590842000186202600000007426070000000740		
Número da Nota 20260000000074	Recebi da empresa META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA os serviços contantes nessa NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS.	
Código de Verificação JDEJ-N5DI	Consulte a autenticidade no site https://chapadinha.portalpublico.net ou através da leitura do QRCode.	

ATESTO QUE:

☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM _____


 Lucas de B. Montelees
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-MA: 111983915-7

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.590.842/0001-86
Razão social: META CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA
Endereço: RUA 16 07 QUADRA37/ RESIDENCIAL ESPLANA / CHAPADINHA / MA / 65500-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/07/2026 a 01/08/2026

Certificação Número: 2026070305455967041189

Informação obtida em 15/07/2026 10:56:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 39.590.842/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:16:33 do dia 20/02/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/08/2026.

Código de controle da certidão: **8308.94AE.80BC.52AF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: META CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 39.590.842/0001-86

Certidão nº: 13088973/2026

Expedição: 02/03/2026, às 11:06:33

Validade: 29/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **META CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.590.842/0001-86**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 052811/26

Data da

26/05/2026 17:10:14

Inscrição Estadual: 126696616

CPF/CNPJ: 39590842000186

Razão Social: META CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA 16, 7 QUADRA37 CEP: 65500000 - RESIDENCIAL ESPLANADA

Telefone: (98)92251962

Município: CHAPADINHA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 24/08/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/05/2026 17:10:14



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 132117/26

Data da

26/05/2026 17:12:55

Inscrição Estadual: 126696616

CPF/CNPJ: 39590842000186

Razão Social: META CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA 16, 7 QUADRA37 CEP: 65500000 - RESIDENCIAL ESPLANADA

Telefone: (98)92251962

Município: CHAPADINHA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 24/08/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/05/2026 17:12:55




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO, TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO
CNPJ - 06.117.709/0001-58
Av. Presidente Vargas, 310 centro

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND N° 1203/2026

Certifico, a requerimento de parte interessada, que a empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSUSTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob n° 39.590.842/0001-86, estabelecida nesta Cidade, na rua 16, n° 07, quadra 37, **Residencial Esplanada**, encontra-se quite com os tributos municipais, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade, cobrar dívidas que por ventura venham a ser apuradas futuramente.

Validade da presente certidão: até 14-09-2026

Chapadinha - MA, 16 de junho de 2026


Prefeitura Mun. de Chapadinha
Elma Machado Araújo
Departamento de Patrimônio
Tributos e Arrecadação


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO, TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO
CNPJ - 06.117.709/0001-58
Av. Presidente Vargas, 310 centro

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA- CNDA N° 1249/2026

Certifico, a requerimento de parte interessada, que contra a empresa META CONSTRUÇÕES E CONSUSTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 39.590.842/0001-86, estabelecida nesta Cidade, na rua 16, nº 07, quadra 37, Residencial Esplanada, bairro Boa Vista, não existe qualquer inscrição na DÍVIDA ATIVA, originada de débitos deste Município, até a presente data, ficando ressalvado a esta Municipalidade o direito de cobrar dívidas, que, por ventura venham a ser apuradas futuramente.

Validade da presente certidão: até 14-09-2026

Chapadinha - MA, 16 de junho de 2026


Prefeitura Mun. de Chapadinha
Elma Machado Araújo
Departamento de Patrimônio
Tributos e Arrecadação
